

空見スラッジリサイクルセンター（仮称）建設事業に係る

事後調査計画書（工事中）

（下水道終末処理場の建設）

平成21年1月

名古屋市上下水道局

# 目 次

第1章 事業者の氏名及び住所、対象事業の名称 .....	1
1 事業者の氏名及び住所 .....	1
2 事業の名称 .....	1
第2章 対象事業の目的及び内容 .....	1
1 事業の目的 .....	1
2 事業の内容 .....	1
第3章 環境影響評価手続きの経緯 .....	18
第4章 環境影響の総合的な評価（工事中） .....	21
第5章 事後調査 .....	49
1 事後調査の目的 .....	49
2 事後調査計画（工事中） .....	49

## 参考資料

(注) 本事後調査計画書の下線( )を付した箇所は、環境影響評価書からの名称・事業内容の変更箇所または新たに追記した箇所を示す。

## 第1章 事業者の氏名及び住所、対象事業の名称

### 1 事業者の氏名及び住所

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号  
名古屋市上下水道局 局長 西部 啓一

### 2 事業の名称

空見スラッジリサイクルセンター(仮称)建設事業(下水道終末処理場の建設)

## 第2章 対象事業の目的及び内容

### 1 事業の目的

本事業は、下水道終末処理場(汚泥処理施設)の建設を目的とする。

### 2 事業の内容

#### 2-1 下水処理の現状

##### (1) 下水道の整備状況

本市では、昭和5年に堀留、熱田の両水処理センターが運転を開始して以来70年余が経過し、平成16年度末における市内の下水道の整備状況は、市街化区域の91.7%にあたる27,620haで整備が完了しており、全市の人口220万人の98.0%にあたる216万人の市民が、下水道を利用可能な状況にある。今後も、下水道普及率100%に向けて、鋭意整備を進めていくものである。本市の下水道整備の概況は図2-1に示すとおりである。

また、水環境の向上に関する社会的意識が高まってきている中、下水道事業が担う役割も多様化してきており、下水道の普及促進のみならず、より高度な下水道システムの構築を進めているところである。

具体的には、本市は、下水道計画区域の約6割が合流式下水道の区域であり、雨天時における公共用水域への汚濁負荷の流出を防止するための合流式下水道の改善<sup>※1</sup>事業や、名古屋港、伊勢湾といった閉鎖性水域における水環境の改善を図るための下水の高度処理化<sup>※2</sup>を進めている。合流式下水道の改善事業としては、雨水滞水池<sup>※3</sup>の建設や夾雑物の公共用水域への流出防止を目的とした設備の設置などを進めている。下水の高度処理化については、現在進めている露橋水処理センターや柴田水処理センターでの整備をはじめとして、各水処理センターについても、今後の改築更新時期との整合を図りながら、効率的に実施していく考えである。

##### (2) 下水汚泥の処理の状況

本市における下水汚泥<sup>※4</sup>の処理については、15箇所の水処理センターから発生する下水汚泥を、専用の汚泥輸送管で市南部に位置する汚泥処理施設を併せもつ3箇所の水処理センター(山崎、柴田、宝神)に集約し、濃縮<sup>※5</sup>、脱水処理<sup>※6</sup>後に焼却処理を行っている。3処理場全体で約25,000m<sup>3</sup>/日(平成13~15年度平均)の汚泥を受け入れ、処理により発生する焼却灰の量は約44t/日(平成13~15年度平均)となっている。その有効利用率<sup>※7</sup>は、平成15年度末で約89%となり全国的にも高い水準にある。有効利用の主な用途は、土質改良材、セメント原料等であり、その他は埋立処分されている。

現在の下水汚泥の処理方式としては、濃縮—脱水—焼却という工程を採用しており、濃縮工程では重力濃縮<sup>※8</sup>、脱水工程ではベルトプレス脱水<sup>※9</sup>または加圧脱水<sup>※10</sup>を主体

に行っており、脱水した汚泥は、流動焼却炉または多段焼却炉にて焼却処理を行っている。

なお、既存の汚泥処理施設の概要は表 2-1 に示すとおりである。

(3) し渣・沈砂の処理の状況

水処理センターやポンプ所、及び雨水桝や下水管の清掃時に取り除いたし渣<sup>\*\*11</sup> や沈砂<sup>\*\*12</sup> は、宝神水処理センターに車両運搬され、宝神水処理センター内に設置されている洗浄施設において、洗浄処理されている状況である。

このうち、し渣については、洗浄脱水後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令を遵守し処分している。

沈砂については、細かい砂と粗い砂に分別して、建設資材などに有効利用している。

表 2-1 汚泥処理施設の概要

施設名称	山崎水処理センター	柴田水処理センター	宝神水処理センター
施設位置	南区忠次一丁目 9-24	南区元柴田西町 2-40	港区宝神四丁目 2501
敷地面積	約 8ha	約 8ha	約 9ha
焼却能力	1号:160t/日(平成2年) 2号:160t/日(平成2年)	1号:150t/日(平成3年) 2号:190t/日(平成9年)	1号:150t/日(昭和51年) 2号:150t/日(昭和61年)
処理方式		同 左	
焼却灰発生量	約 9t/日	約 12t/日	約 23t/日
焼却灰の主な利用用途	セメント原料、陶管、透水性ブロック、タイル 土質改良材(鳴海改良土センターで利用) など		土質改良材 (鳴海改良土センターで利用)

注) ( )内は供用開始年度を示す。

敷地面積は、汚泥処理施設の他に、下水処理施設を含む全体の面積である。

焼却は重量ベースで能力を表示するため t/日 で表す。

焼却灰発生量は平成 13～15 年の平均値を示す。

注)

<sup>\*\*1</sup> 合流式下水道の改善 : 下水を流す方法には、汚水と雨水を同じ管で流す「合流式下水道」と、別々の管で流す「分流式下水道」の 2 種類があり、合流式下水道の場合、晴れた日であれば、すべての汚水が水処理センターに送られて処理される。しかし、雨の日になると、一定の量を超えた雨水は汚水といっしょに直接河川へ放流されてしまうため、こうした「合流式下水道」の欠点を緩和するために、雨水滞水池などを設置する施策のこと。

<sup>\*\*2</sup> 下水の高度処理化 : 通常の下水処理で得られる水質以上に、伊勢湾の富栄養化の原因となっている窒素やリンを除去することができる高水準な処理方法のこと。

<sup>\*\*3</sup> 雨水滞水池 : 管きょ内や路面に堆積した汚れを多く含んだ降雨初期の下水を、一時的に貯留し、合流式下水道からの越流水による汚濁負荷量を減少させるための施設。

<sup>\*\*4</sup> 下水汚泥 : 下水処理過程において発生する泥状の沈殿物。なお、量の表示は m<sup>3</sup>/日 で表す。

<sup>\*\*5</sup> 濃縮処理 : 汚泥処理の第 1 段階の処理であり、その後続く処理を効率的に行うために汚泥を濃縮すること。

<sup>\*\*6</sup> 脱水処理 : 固形物として取り扱える程度まで含水率を下げること。

<sup>\*\*7</sup> 有効利用率 : 発生した灰を有効利用している割合。

<sup>\*\*8</sup> 重力濃縮 : 重力により汚泥を沈降させて濃縮する方法。

<sup>\*\*9</sup> ベルトプレス脱水 : 二枚のろ布の圧搾とせん断により濃縮汚泥を脱水する方法。

<sup>\*\*10</sup> 加圧脱水 : ろ板の間で圧力をかけて濃縮汚泥を脱水する方法。

<sup>\*\*11</sup> し渣 : 下水または汚泥中に含まれているゴミなど。

<sup>\*\*12</sup> 沈砂 : 下水または汚泥中に含まれている砂分。



出典:「なごやの水道・下水道」(平成 18 年度版 名古屋市上下水道局)から作成

図 2-1 下水道整備の概況

## 2-2 下水道事業の基本方針と本事業の必要性

下水道事業のうち、汚泥処理に関する主な基本方針を整理すると、以下のとおりである。

### (1) 水環境の向上

下水の高度処理化、合流式下水道の改善により河川に放流する汚濁負荷量を削減し、水環境の向上を図る。

### (2) 汚泥量増加への対応

下水の高度処理化、合流式下水道の改善による汚泥量の増加に対応し、汚泥処理施設の増強を図る。

### (3) 施設の改築更新

下水道施設の改築更新に際しては、施設の老朽化を考慮し優先度を設けるなど効率的な整備を図る。

### (4) 周辺環境との調和

汚泥処理施設を有する水処理センターの周辺は建設当時から比べて宅地化が進むなど土地の利用状況は変化してきている。これらを考慮し、周辺環境と調和のとれた汚泥処理施設計画を進めていく。

### (5) 下水道資源の有効利用

下水汚泥の焼却灰は、現在、土質改良材を始めセメント原料、ブロック等に有効利用されている。今後は、その他の建設資材などへの利用用途を広げ、一層のリサイクルの促進を図る。

以上を踏まえると、水環境の向上を図るためには、公共用水域の水質改善策として、各水処理センターにおける下水の高度処理化、及び合流式下水道の改善が必要であり、これらに伴って増加する汚泥量に対して汚泥処理施設の増強も必要不可欠である。

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が進んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。特に、宝神水処理センターにおける焼却炉を始めとした汚泥処理施設は、他の2汚泥処理施設に比べて処理方式が古く、老朽化も進み、早急な改築更新が必要な状況にある。

これに対して、既存の汚泥処理施設を有する水処理センターはいずれも用地が狭いため、現在の処理能力を維持した上での更新は困難な状況にあり、さらに下水の高度処理化及び汚泥処理施設の増強のための用地が必要となるが、既存の汚泥処理施設を有する水処理センターの焼却炉は屋外に設置されており、周辺の景観との調和に関して課題を残している。また、建設当時から比べて周辺の宅地化が進むなど土地の利用状況が変化してきており、用地を拡張することも困難な状況にある。

さらに、汚泥焼却灰の有効利用については、発生量の抑制と利用用途の拡大が課題となっている。特に、宝神水処理センターの汚泥処理施設において発生する石灰系の汚泥焼却灰については、他の2汚泥処理施設で発生する高分子系のものに比べ、発生量が多く、利用用途も限られている。そのため、処理方式を統一することで、発生量の抑制と利用用途の拡大による有効利用率の向上を図る必要がある。

これらの状況に対処するためには、新たな用地において汚泥処理施設を建設することが不可欠であり、施設の老朽化が著しく早急な改築更新が必要な宝神水処理センターに

できるだけ近く、将来の汚泥量増加を見据え一定のまとまった用地取得が可能であり、かつ付随する既存の汚泥輸送管のネットワークを有効に利用できるという観点から、宝神水処理センターの南約3kmの空見町地内に位置する事業予定地に新たな汚泥処理施設の建設を行うものである。また、併せて宝神水処理センターの汚泥処理施設を休止する。なお、宝神水処理センターの水処理施設については、将来的に高度処理化を図りつつ処理能力の増強を予定している。

建設にあたっては、港湾地域計画等との整合を図りながら整備を行っていくものとし、周辺地域への熱供給などを視野に入れながら、効率性、経済性、維持管理性に優れた省エネルギー型のシステムの採用、焼却灰のリサイクルの促進及び廃熱エネルギーなどの活用を図り、循環型社会の形成に寄与するように努めた施設づくりを目指すものとする。

## 2-3 下水汚泥処理全体計画

下水汚泥は、表 2-2 に示すとおり、今後の下水の高度処理化、合流式下水道の改善等の事業進展により増加すると見込んでおり、将来の発生汚泥量は約 34,000m<sup>3</sup>/日(日平均)の予定である。なお、下水の高度処理化と合流式下水道の改善についての事業方針は以下に示すとおりである。

### <下水の高度処理化>

公共用水域の水質保全の観点から、将来的には全水処理センターで実施する予定であるが、事業実施には多大な費用と長い年月がかかるため、施設の老朽化に対して必要となる改築更新時期を捉えての効率的実施を基本にすすめる。

その結果、概ね 20 年後において既存水処理センターの約 30%を高度処理化し、その他においても暫定的に凝集剤添加による対応を行う予定である。

### <合流式下水道の改善>

本市の約6割を占める合流式区域において、既存の合流式下水道は活かしつつ、システム上、未処理の状態で放流される汚濁負荷の高い下水の量を抑制することで、合流式区域における河川等へのBOD負荷量<sup>\*1</sup>を削減する施策をすすめる。

具体的には、降雨初期の汚れた下水を一時貯留する雨水滞水池の設置を主体に取り組んでいく予定である。

その結果、概ね 20 年後にはこれら所定の合流式下水道の改善を、100%整備する予定である。

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が進んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。したがって、将来増加する発生汚泥量に対応するための能力増強も視野に入れた施設の改築更新を段階的に進めていく必要がある。

整備にあたっては、既存の汚泥処理施設を有する水処理センターはいずれも用地が狭く、改築更新及び能力増強が困難な状況にあることから、全体計画としては、下水汚泥処理についてのスケールメリットや、効率的な環境対策の実施を図るため、図 2-2 に示すとおり、現在の3箇所の集約処理から最終的には本施設を含め、2箇所集約処理に移行していく計画である。

なお、本施設では全市の発生汚泥量の約6割を処理する計画で施設の整備を進める。

また、し渣・沈砂の処理については、今後も継続的に同様の処理を行う計画であるが、宝神水処理センターの水処理施設の増設時期、及び既存のし渣沈砂洗浄設備の耐用年数経過を考慮した整備を進める計画である。

表 2-2 計画下水汚泥量

発生原因 別事業	現状発生 汚泥量 (m <sup>3</sup> /日)	将来発生 汚泥量 (m <sup>3</sup> /日)	整備率	算出根拠
下水道整備	約 24,500	約 26,000	約 100 %	下水道の普及及び水洗化率の向上による。 (H13~15年)整備率 97%、水洗化率99.7% : 24,500m <sup>3</sup> /日 (将来)整備率100%、水洗化率100% : 将来発生汚泥量=24,500/0.97/0.997 =25,300→約26,000m <sup>3</sup> /日
合流式下水道 の改善	約 350	約 3,000	約 100 %	合流改善による回収可能な汚濁負荷の増加による。 合流改善整備面積 : 16,906 (ha) 地表面汚濁負荷量 : 183 (kg/ha/年) 名古屋市の年間降雨日数 : 110 (日) 将来発生汚泥固形物量=16,906×183/1000/110=28.1t/日 将来発生汚泥量 (汚泥濃度1%) =28.1/0.01=2,810 →約3,000m <sup>3</sup> /日
下水の 高度処理化	—	約 4,500	約 65 %	高度処理の採用による。 除去率向上による増加 : 12%増加 凝集剤添加による増加 : 11%増加 将来発生汚泥量 = (下水道整備による将来発生汚泥量 + 合流式下水道の改善による将来発生汚泥量) ×汚泥増加率×整備率 =(26,000+3,000)×(0.12+0.11)×0.65 =4,335 →約4,500m <sup>3</sup> /日
発生汚泥量	約 25,000	約 34,000	—	—

注)現状発生汚泥量は平成 13 年から平成 15 年の年間平均を示す。

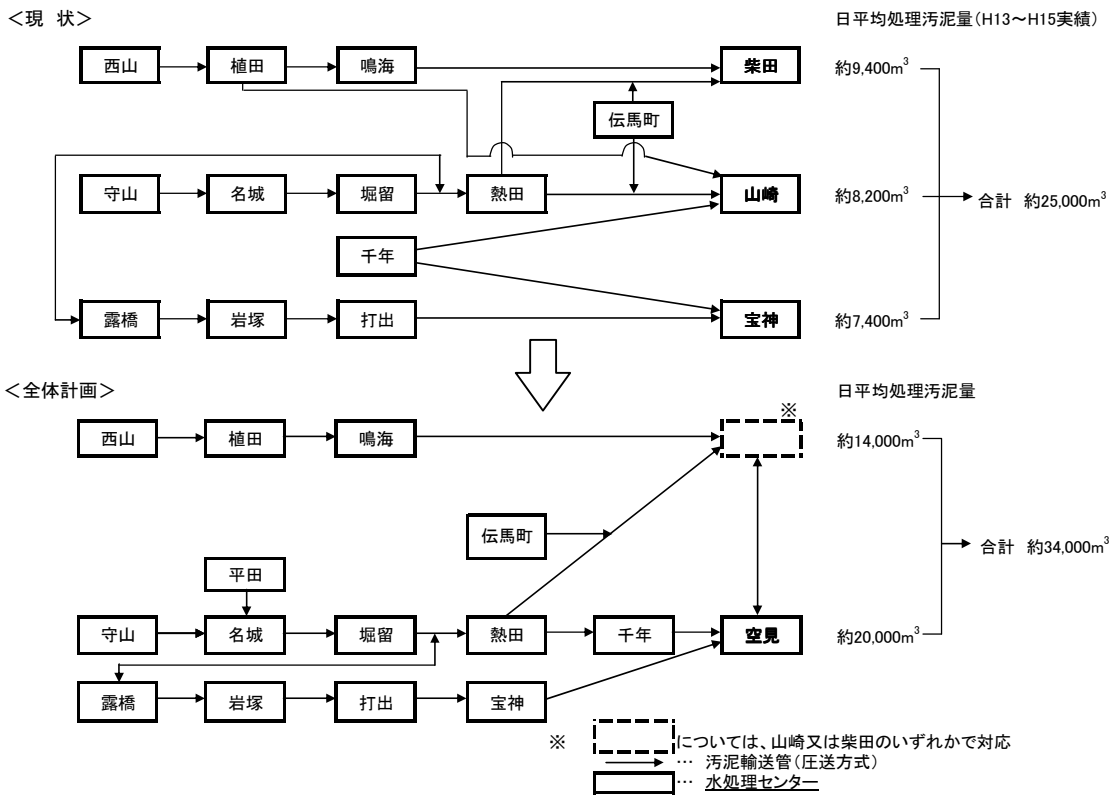


図 2-2 下水汚泥の集約処理計画

注)

※<sup>1</sup>BOD 負荷量:BODは、水の汚れ(有機物)の指標であり、数値が高いほど汚れていることを示し、水の汚れを微生物によって分解するときに消費される酸素量(生物化学的酸素要求量)のこと。BOD 負荷量はその量のこと。



## 2-4 事業の内容

### (1) 対象事業の種類

下水道終末処理場の建設

### (2) 事業予定地の位置及び面積

ア 位置 名古屋市港区空見町1番地の5及び9(図2-3参照)

イ 面積 約16 ha

### (3) 事業計画の概要

第1期工事の土木・建築工事は本施設全体の1/2規模の施設を対象とし、敷地全体の造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むものである。また、第1期工事の設備工事は本施設全体能力の1/4規模の施設が対象である。

第2期工事以降は事業着手から概ね20年程度を目途に汚泥量の増加に合わせて、本施設全体能力の1/4規模を超えない範囲で段階施工を行う計画である。

#### ア 施設規模と型式

##### (ア) 計画汚泥量

日平均 : 本施設全体供用時:20,000m<sup>3</sup>/日 (日最大:27,000m<sup>3</sup>/日)  
第1期施設供用時: 5,000m<sup>3</sup>/日 (日最大:6,750m<sup>3</sup>/日)  
汚泥処理方式 : 遠心濃縮<sup>\*1</sup>—スクリープレス脱水<sup>\*2</sup>—流動焼却

##### (イ) 焼却規模と型式

型式 : 流動焼却炉  
焼却能力 : 本施設全体供用時 1,600t/日 (200t/日×8炉)  
第1期施設供用時 400t/日 (200t/日×2炉)  
煙突 : 高さ 80m (内筒4本、外筒1本)  
灰発生量<sup>\*3</sup> : 本施設全体供用時 約60t/日 (土質改良材、セメント)  
第1期施設供用時 約15t/日 (原料などへ有効利用)

##### (ウ) 返流水処理施設

処理方式 : 凝集沈殿法<sup>\*4</sup> (処理水は宝神水処理センターへ送水)  
返流水処理能力 : 本施設全体供用時 40,000m<sup>3</sup>/日 (日最大)  
第1期施設供用時 10,000m<sup>3</sup>/日 (日最大)

##### (エ) し渣、沈砂洗浄棟

し渣洗浄能力 : 本施設全体供用時 3,000t/年  
沈砂洗浄能力 : 本施設全体供用時 12,000t/年

し渣は、産業廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令を遵守し処分する計画である。沈砂は埋め立て材などに有効利用する計画である。なお、宝神水処理センターにある既存のし渣・沈砂洗浄施設の耐用年数を考慮して新設する。

注)

- \*1 遠心濃縮機 : 遠心力を利用した回転形の濃縮機。  
\*2 スクリープレス脱水機 : 円筒状のスクリーンとスクリー羽根から構成され、スクリー羽根の圧搾とせん断力により脱水する脱水機。  
\*3 灰発生量 : 汚泥が焼却されると約30%の無機分が灰となって発生する。  
(本施設全体供用時 20,000m<sup>3</sup>/日×1/100(汚泥濃度1.0%)×30/100(無機分30%)=60t/日)  
(第1期施設供用時 5,000m<sup>3</sup>/日×1/100(汚泥濃度1.0%)×30/100(無機分30%)=15t/日)  
\*4 凝集沈殿法 : 凝集剤により汚濁物質を沈殿除去する方法。

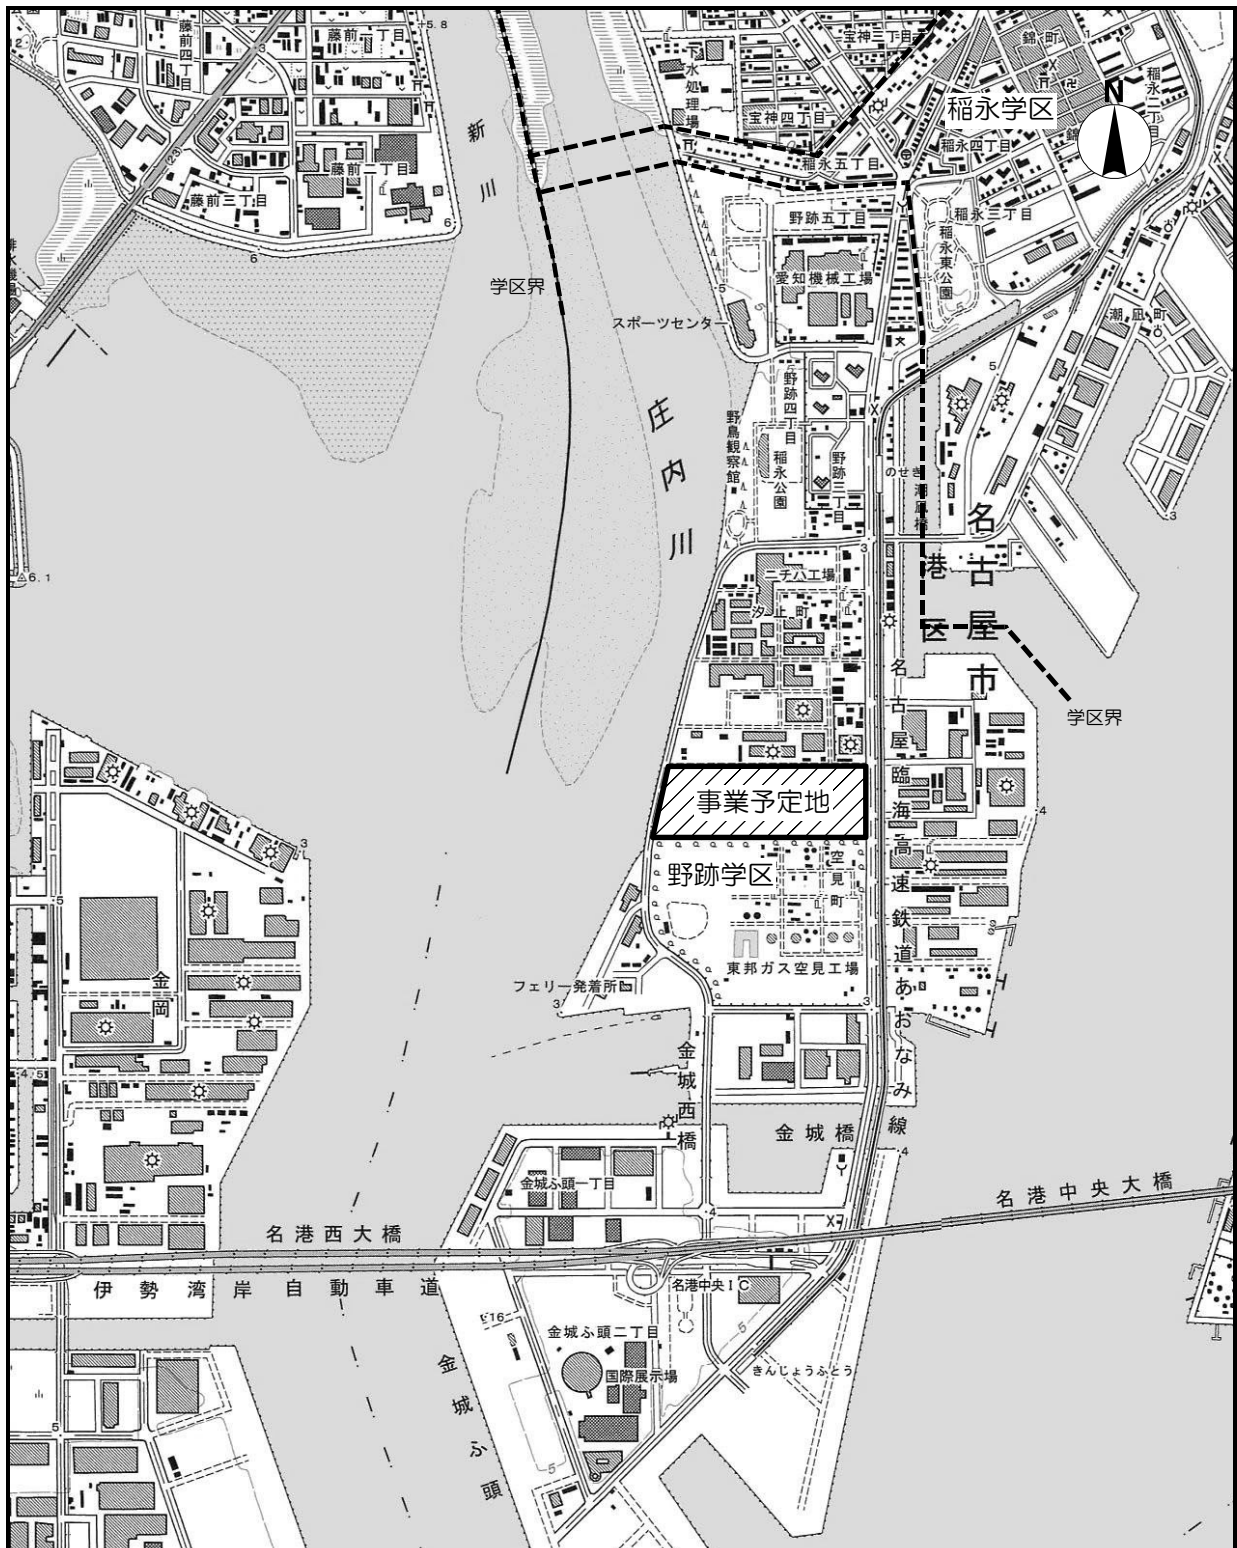


図 2-3 事業予定地の位置

## イ 施設計画

施設の概要は表 2-3 に示すとおりである(評価書時点の施設概要は、参考資料参照)。

施設は、機能毎に別棟とし、受泥棟、汚泥棟、焼却炉棟、返流水処理施設、管理棟、受電棟、し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟及び熱利用棟を計画する。

汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用途を検討し、熱の有効利用を図ることとする。

なお、し渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟のみ昼間運転とし、それ以外の施設は 24 時間稼働である。

表 2-3 施設の概要

項目	施設の概要	施設の形状寸法	
		第 1 期施設供用時	本施設全体供用時
受泥棟	汚泥の受入、貯留を行う施設	平面:52m×46m 高さ:13m	平面:91m×46m 高さ:13m
第 1 汚泥棟	汚泥の脱水などを行う施設	平面:118m×40m 高さ:25m	
第 2 汚泥棟	同上	—	平面:118m×40m 高さ:25m
第 1 焼却炉棟	脱水汚泥を焼却する施設	平面:59m×95m 高さ:25m	平面:110m×95m 高さ:25m
第 2 焼却炉棟	同上	—	平面:110m×95m 高さ:25m
返流水処理施設	返流水を凝集沈殿法により処理する施設	平面:30m×83m 高さ:6m(地下 12m)	平面:56m×83m 高さ:6m(地下 12m)
受電棟	本施設の受電を行う施設	平面:31m×24m 高さ:15m	平面:31m×53m 高さ:15m
熱利用棟	焼却廃熱を利用する施設	平面:51m×29m 高さ:18m	
し渣洗浄棟	本施設及び各水処理センター等から発生するし渣を洗浄脱水する施設	—	平面:30m×50m 断面:高さ 20m
沈砂洗浄棟	本施設及び各水処理センター等から発生する沈砂を洗浄する施設	—	平面:48m×50m 断面:高さ 20m
管理棟	本施設の運転管理を行う施設	平面:25m×44m、高さ:11m	

## ウ 配置計画

配置計画は、図 2-4(1)～(2)に示すとおりである(評価書時点の配置計画は、参考資料参照)。

配置計画は、当初計画を見直し、以下に示す内容を変更した。これにより、機能の合理化、建設コストを含めたトータルコストの低減を図る。

- ・ 返流水処理方式について、コスト、維持管理性の観点から、水処理方式の見直しを行い、施設をよりコンパクトにした。
- ・ 汚泥棟への送泥距離を短くし、維持管理上のリスクを軽減するため、受泥棟を第1汚泥棟と第2汚泥棟の間に配置した。
- ・ 周辺環境対策に配慮し、臭気の漏洩が懸念されるし渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟を敷

地中央部にあたる第1焼却炉棟と第2焼却炉棟の間に配置した。

- ・ 熱利用効率を高める観点から、熱利用棟を設け、最短の動線で熱回収が可能な第1焼却炉棟と第2焼却炉棟の間に配置した。
- ・ 受電・ポンプ棟は、返流水を自然流下で送水することとしたためポンプ施設がなくなり、受電棟とした。
- ・ 管理棟は、正門からの動線を考慮して正門や駐車場から近い位置とし、受電棟と配置替えした。
- ・ 返流水処理施設の第1期整備位置は、返流水の返送ルートが東側方向であることから、敷地境界に近い東側とした。

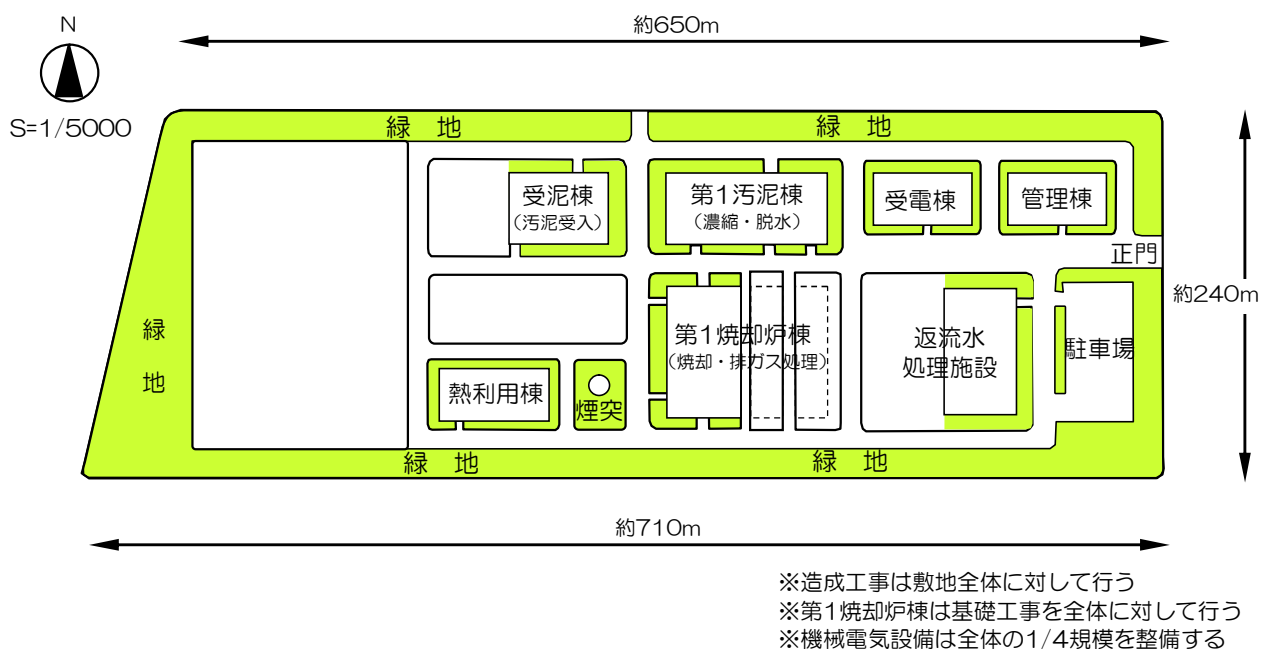


図 2-4(1) 第1期施設配置計画


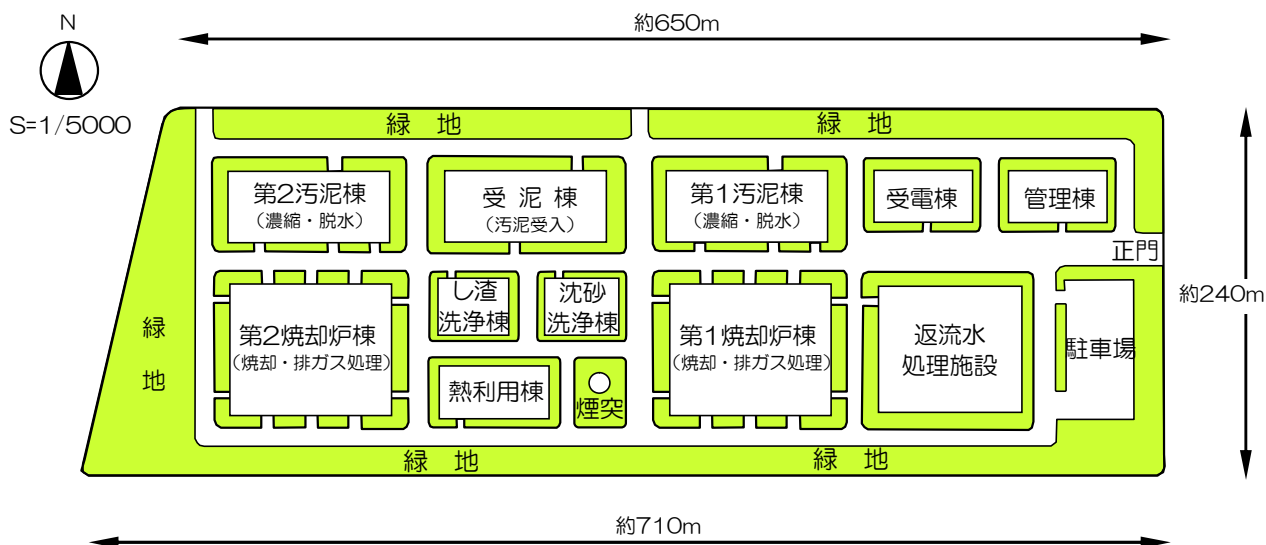


図 2-4(2) 全体施設配置計画

エ 汚泥処理フロー

汚泥処理フローは図 2-5 に示すとおりであり、汚泥、排ガス及び返流水系統は図 2-6 に示すとおりである。

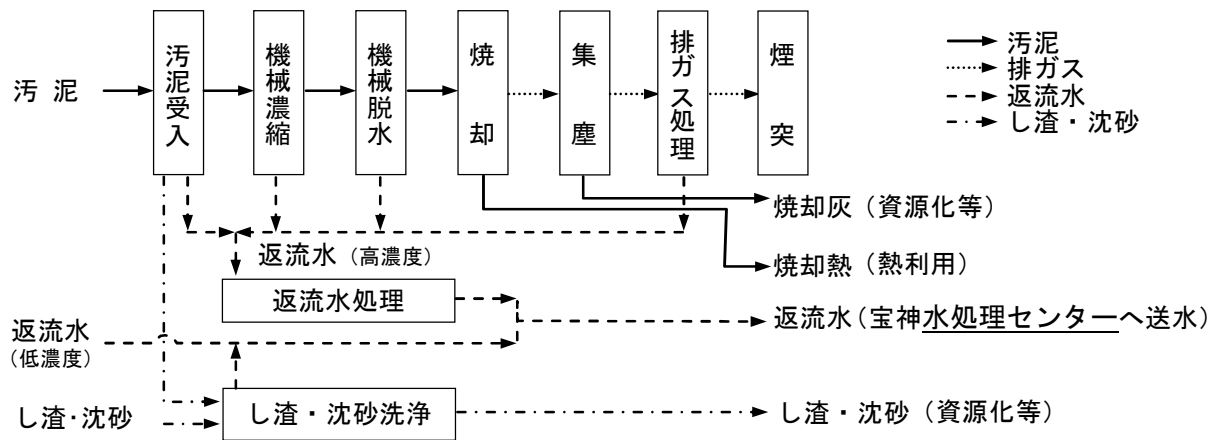

- 汚泥 : 汚泥輸送管で輸送された各水処理センターで発生した汚泥。
- 返流水(高濃度) : 濃縮や脱水処理により発生する高濃度な排水。
- 返流水(低濃度) : 本施設内で発生する雑排水などの低濃度な排水。
- 機械濃縮 : 汚泥を機械により強制的に濃縮する。
- 機械脱水 : 濃縮した汚泥を機械により脱水し、後段の焼却効率を高める。
- 焼却 : 脱水した汚泥を焼却により減量化及び質の安定化させる。
- 集塵 : 焼却により発生した排ガス中のばいじんを除去する。
- 排ガス処理 : 焼却により発生した排ガス中の有害物質を除去する。
- 返流水処理 : 汚泥処理過程で発生した返流水を宝神水処理センターで処理可能な水質まで処理を行う。
- し渣・沈砂洗浄 : 汚泥処理過程で発生したし渣、沈砂及び各水処理センター等で発生し、本施設に運搬したし渣、沈砂の洗浄脱水を行う。

図 2-5 計画処理フロー

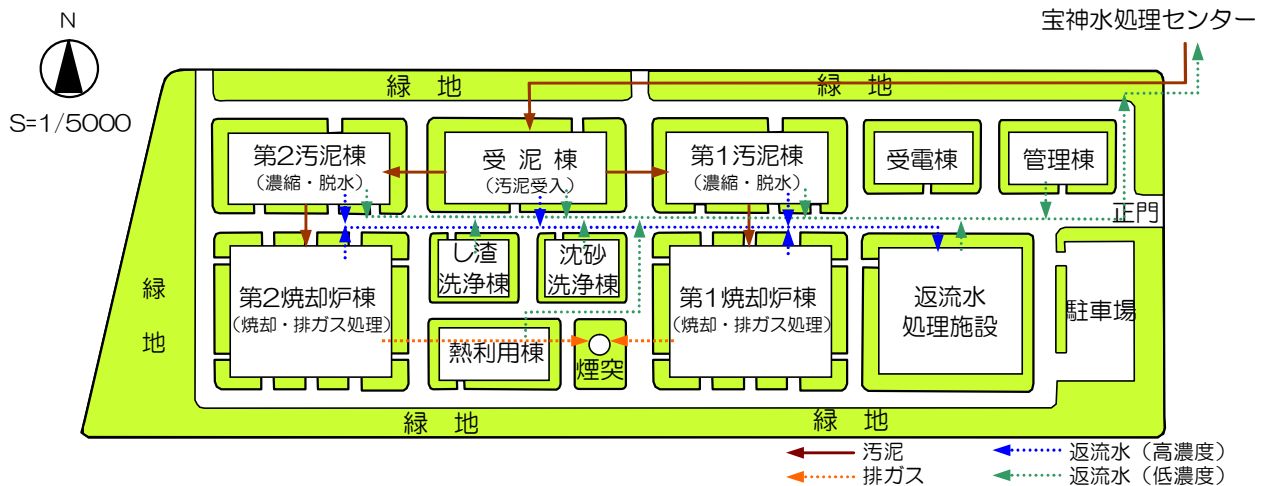


図 2-6 汚泥、排ガス及び返流水の計画系統図

## オ 緑化計画

緑化にあたっては、樹種の選定に際しては周辺に存在する潜在自然植生に配慮した緑化を行うとともに、事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き続き生息できるような環境を創出することに配慮するなど、具体的な緑化計画の策定にあたっては、以下に示すコンセプトを基本にすすめる。

なお、第1期施設供用時において、主に敷地周囲約20mを緑化し、敷地面積の20%以上(本施設全体供用時では約30%)を緑地とする。

### 【周辺環境への配慮】

- ・施設内の緑化推進により、ヒートアイランドの抑制に努める。
- ・「名古屋港景観基本計画」の港湾景観形成の基本方針にもある“まちや既存の緑地との一体性に配慮”を意識し、広域的な観点から、将来的な周辺の緑化ベルトにも対応できるよう、本施設内の緑化についてもできる限り連続性を持たせた配置を目指す。
- ・自然環境保全の観点から、植栽種の選定にあたっては、外来種を避け、周辺に存在する潜在自然植生の樹種を基本に検討をすすめるとともに、その整備についても維持管理まで含めた長期的な視点にたち、動物や植物の多様性を踏まえ生態系の維持にも配慮した緑化計画をすすめる。

### 【生き物とのかかわり】

- ・事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き続き生息できるような環境を創出し、その保全に努める。

### 【人の交流】

- ・来訪者が気軽に利用でき、緑を通じて訪れる人々に対して安らぎを与えるような緑地の配置や機能を持たせる。

## カ 雨水排水計画

事業予定地内に降った雨水は側溝で集水し、表 2-4 に示す放流先に放流する。なお、雨水の一部は場内で洗浄用水や散水用水等に利用するとともに、保水性舗装の設置や緑化による地下浸透を図ることで、敷地外への雨水流出量を極力低減させる。

表 2-4 雨水放流先

項目	放 流 先
工事中	場内の雨水は、現状どおり周囲の側溝及び既設排水管に排水し、事業予定地周辺の庄内川及び名古屋港に放流する。
供用時	側溝で集水した雨水は、事業予定地西側の庄内川に放流する。

## キ 供用開始時期

平成 26 年度第 1 期施設供用開始

## ク 処理方式の検討経緯

本市の既存の3汚泥処理施設は、現在すべての施設において焼却処理を行っており、発生する焼却灰の有効利用については、平成15年度において有効利用率が約89%となり、全国的にも高い水準を維持している状況である。一方、現況の汚泥処理における課題としては、下水汚泥の集約処理により長距離輸送に伴う嫌気化や汚泥性状の変動が生じやすい状況にあり、濃縮工程での沈降性の悪化を招き、後段の汚泥処理全体の効率性の低下を引き起こすケースもあり、これに対する対策が必要となっている。また、焼却炉に関しては、適正な環境対策を維持しつつ安定した汚泥処理を継続するための機能を有し、かつ実績のある方式の選択が必要である。併せて汚泥処理過程で発生する返流水は、通常の下水の水質に比べ高濃度であり、併設する水処理施設への影響に配慮する必要がある。そのため、新たに建設する本施設については、以上に掲げた課題を踏まえ、以下に示すとおり処理方式の検討を進めた。

### (ア) 濃縮

濃縮は、受け入れた汚泥の最初の処理工程であるため、汚泥性状の変動や量的変動に対しても安定的かつ効率的な処理が可能であることを第一条件に考え、「遠心濃縮機」を導入する計画である。

### (イ) 脱水

脱水は、現在、山崎水処理センターと柴田水処理センターで採用しているベルトプレス脱水機を含め検討を進めてきたが、ベルトプレス脱水機は、機器が多台数となり維持管理機器点数が多くなること、システム上の特性から洗浄水を多量に使用すること、臭気の捕臭性が悪いことなどを考慮した上で、安定処理、少使用水量、省エネルギーといった観点からの優位性が認められる「スクリープレス脱水機」を導入する計画である。

### (ウ) 焼却

焼却は、これまでどおり、焼却灰の有効利用の推進及び悪臭対策やNO<sub>x</sub>対策などに優位性があり、かつ燃焼効率に優れたものとして、現在、山崎水処理センターと柴田水処理センターでも採用している「流動焼却炉」を導入する計画である。


### (エ) 返流水処理

返流水処理は、汚泥処理工程から発生する高濃度な返流水を、返送先の宝神水処理センターの水処理に悪影響を及ぼさないレベルまで本施設内で処理をするものであり、処理方式の検討に際しては、運転管理が容易で、省スペース、省エネルギーであり経済性でも有利な「凝集沈殿法」を採用する計画である。

なお、本施設の第1期施設供用時においては、返流水を宝神水処理センターへ返送した場合でも、放流水の濃度、負荷量ともに現況を下回ると推定している。また、本施設全体供用時においても、高度処理施設の導入により、同様の結果が得られると推定している。(図2-7参照)


上記に示したとおり、処理方式の検討を進め、今後の事業化に向けた詳細検討をしていく予定であるが、本施設で対象としている汚泥処理、返流水処理の方式は、技術革新が著しいため、今後の新技術などの動向を考慮して、より効率的で省エネルギー型の技術が発生した場合には、柔軟に対応を検討し、処理方式等を選定することとする。

<現状>




項目	流入下水(A)		返流水(B)		混合水(A+B)		放流水	
	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)
BOD	113	9.46	397	12.43	190	21.88	7.0	0.50
COD	86	7.20	347	10.86	157	18.06	14.0	1.01
SS	109	9.12	1080	33.80	373	42.93	8.0	0.58
T-N	22.0	1.84	71.2	2.23	35	4.07	16.3	1.18
T-P	4.0	0.33	22.5	0.70	9	1.04	1.1	0.08

<第1期: 宝神水処理センターに空見の第1期分の返流水が返送された場合>

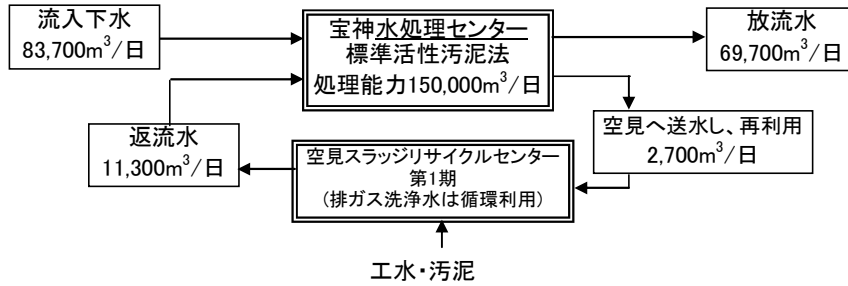

項目	流入下水(A)		返流水(B)		混合水(A+B)		放流水	
	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)
BOD	113	9.46	352	3.98	141	13.44	5.2	0.36
COD	86	7.20	91	1.03	87	8.23	7.7	0.54
SS	109	9.12	91	1.03	107	10.15	2.2	0.15
T-N	22.0	1.84	51.0	0.58	25.4	2.42	11.7	0.82
T-P	4.0	0.33	4.2	0.05	4.0	0.38	0.5	0.03

<全体: 宝神水処理センターに高度処理導入、空見の全体計画の返流水が返送された場合>

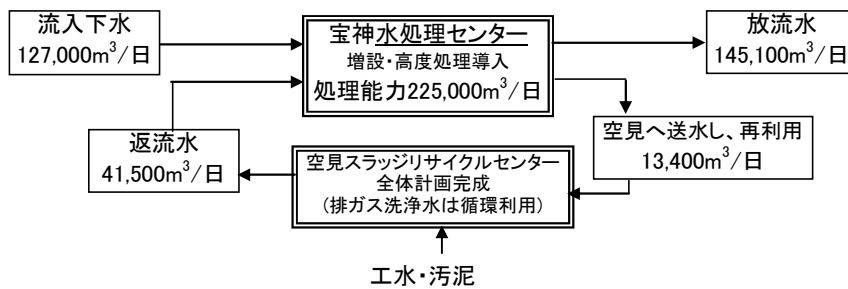

項目	流入下水(A)		返流水(B)		混合水(A+B)		放流水	
	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)	濃度 (mg/l)	負荷量 (t/日)
BOD	113	14.35	352	14.61	172	28.96	3.4	0.49
COD	86	10.92	91	3.78	87	14.70	6.3	0.91
SS	109	13.84	91	3.78	105	17.62	1.0	0.15
T-N	22.0	2.79	51.0	2.12	29.1	4.91	7.4	1.07
T-P	4.0	0.51	4.2	0.17	4.0	0.68	0.4	0.06

※水量は日平均値を示し、返流水量については高濃度返流水と低濃度返流水の合計値を示している。処理能力は日最大で表示している。

図 2-7 返流水返送による宝神水処理センター放流水の濃度と負荷量



(4) 工事実施計画の概要

第1期施設の工事は、現土地所有者による現地上構造物の解体撤去後に着工するものとし、平成20年度から工事を開始し、平成26年度の供用開始を目指す。第2期施設以降の工事は、発生汚泥量の増加にあわせ、概ね20年程度を目途に、敷地の東側から西側へ段階的に工事を行う計画である。

環境影響評価書の予測評価の対象とした工事範囲は、表2-5に示すとおりである。

表2-5 環境影響評価書の予測評価の対象とした工事範囲

工事区分	工事範囲
第1期工事	第1期施設の工事範囲は、図2-8に示すとおりであり、土木・建築工事は、本施設全体の1/2規模の施設を対象とし、設備工事は、本施設全体の1/4規模の施設を対象とする。 なお、第1期施設工事は、敷地全体の造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むことから本事業においては最も工事規模が大きい。第2期施設以降の工事は、本施設全体能力の1/4規模を超えない範囲で段階施工を行う。
西側施設工事	ラムサール条約登録湿地に隣接する西側での最大規模の工事範囲は、図2-9に示すとおりであり、土木・建築工事は、受泥棟が1/2規模、第2汚泥棟が全体施設を対象とし、第2焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行う。設備工事は本施設全体能力の1/4規模の施設を対象とする。

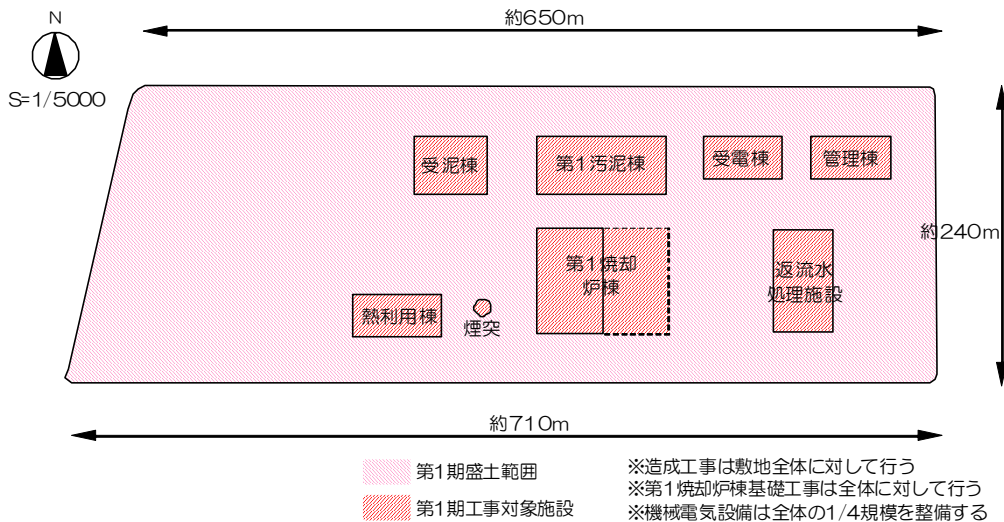


図2-8 第1期工事範囲

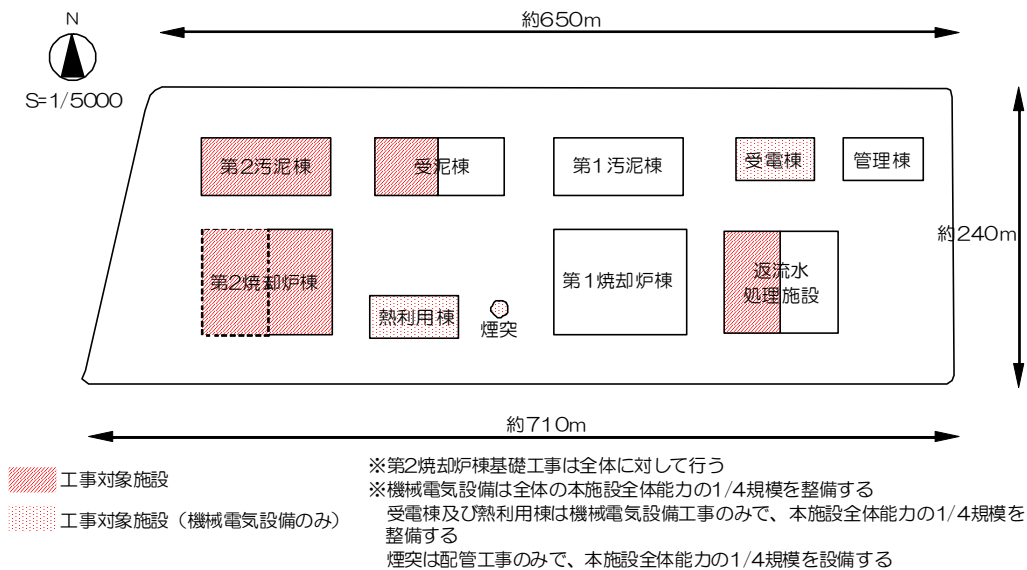


図2-9 西側施設工事範囲

ア 土木・建築工事

土木工事は、本施設建設にあたって支障となる現存施設の基礎杭、地中ベースコンクリートなどの既設地下構造物の撤去を行い、その後、基礎杭を打設し、各施設の地下構造物の建設、建築工事、造成及び場内整備の順に行う。造成にあたっては、浸水を考慮して現況地盤から約 1m 盛土する計画である。

既設地下構造物の撤去、各施設の地下構造物の建設にあたっては、掘削部の深度に対応して止水性のある土留め壁等を用い締め切った状態で行う、あるいは、止水性の高いソイルセメント地下連続壁を不透水層まで貫入させ側面を止水した状態で掘削を行う等の地下水のしみ出しを抑える締切工法を採用する。

また、コンクリート打設に伴うアルカリ性排水についても、上述の締切工法により敷地外への流出を抑える。

建築工事は各施設の地下構造物の建設終了後に汚泥棟、管理棟などの建設を行う。

イ 設備工事

設備工事は、土木・建築工事終了後に汚泥焼却設備、受電設備などの機械設備、及び電気設備の据え付け等を行う。

ウ 工事期間

工事期間は、平成 20 年度から平成 40 年度頃を予定しており、このうち工事規模が大きく、環境影響評価の対象となっている第1期施設工事及び西側施設工事の工程は、表 2-6 及び表 2-7 に示すとおりである。

表 2-6 第 1 期施設の工事工程表

区分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
土木・建築工事	■						
設備工事				■			1部供用開始

■ : 現地工事

表 2-7 西側施設工事工程表

区分	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
土木・建築工事	■					
設備工事			■			西側施設一部供用開始

■ : 現地工事

エ 工事関連車両の走行ルート

工事関連車両の走行ルートは図 2-10 に示すとおりである。

走行ルートは、工事関連車両の分散化、事業予定地入退場の混雑緩和のため、2 ルートとした。


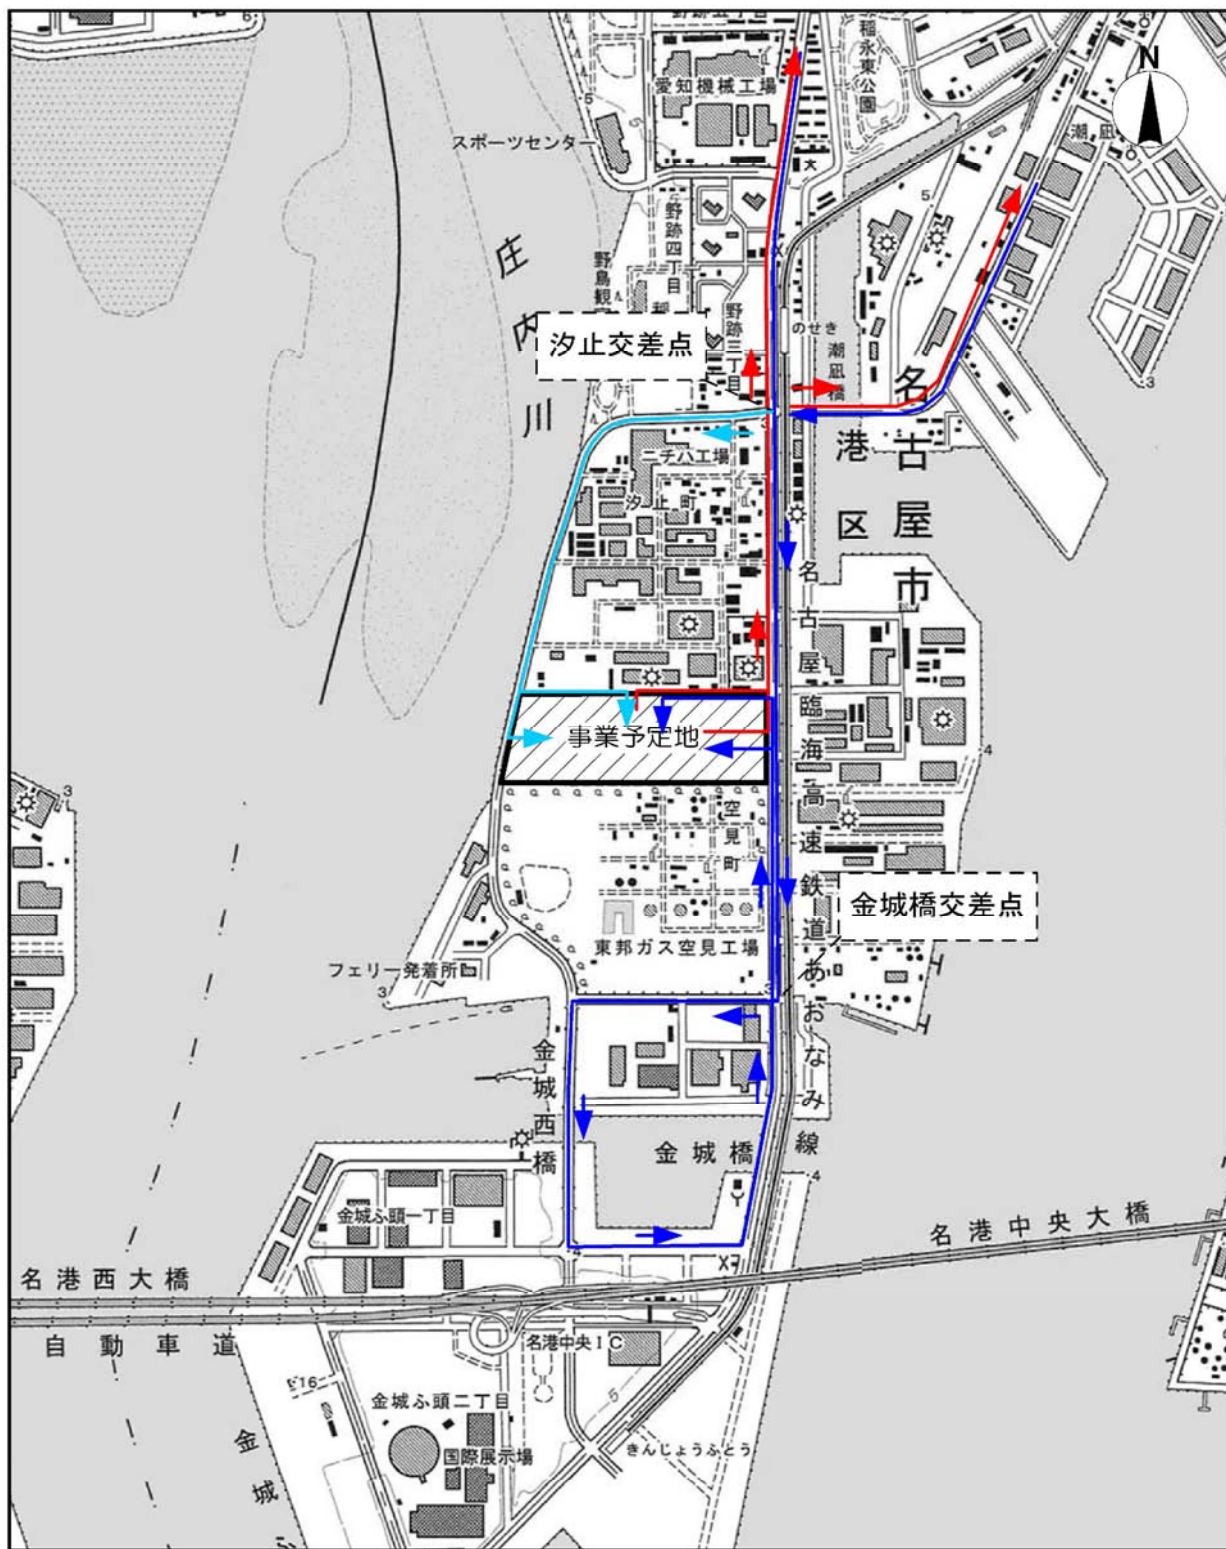


図 2-10 工事関連車両の走行ルート

凡 例	
	: 工事関連車両 (往路: 第1ルート)
	: 工事関連車両 (往路: 第2ルート)
	: 工事関連車両 (復路)

### 第3章 環境影響評価手続きの経緯

環境影響評価手続きの経緯は表 3-1(1)～(2)に示すとおりである。

表 3-1(1) 環境影響評価手続きの経緯

事 項		日 程 等	
環境影響評価 方法書	提 出		平成 15 年 6 月 23 日
	縦 覧	期 間	平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室 及び 16 区役所
		縦覧者数	18 人
	事業者による 閲覧	期 間	平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日
		場 所	上下水道局下水道本部下水道建設部計画課 及び西部管路事務所当知出張所
		閲覧者数	6 人
環境影響評価 方法書に対する 市民等の意見	提出期間		平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 8 月 14 日
	提出件数		7 件
環境影響評価 方法書に対する 市長の意見 (方法意見書)	縦 覧	期 間	平成 15 年 9 月 26 日から平成 15 年 10 月 10 日
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室 及び 16 区役所
		縦覧者数	4 人
環境影響評価 準備書	提 出		平成 18 年 1 月 25 日
	縦 覧	期 間	平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 7 日
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室 及び 16 区役所
		縦覧者数	15 人
	説明会	開催日	平成 18 年 2 月 12 日
		場 所	名古屋市立野跡小学校 体育館
参加者数		39 人	

表 3-1(2) 環境影響評価手続の経緯

事 項		日 程 等		
環境影響評価準備書に対する市民等の意見	提出期間	平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 22 日		
	提出件数	1 件		
見 解 書	提 出	平成 18 年 5 月 25 日		
	縦 覧	期 間	平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 6 月 15 日	
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室及び 16 区役所	
		縦覧者数	5 人	
公聴会		陳述の申出が無かったため開催せず。		
環境影響評価準備書に対する市長の意見(環境影響評価審査書)	縦 覧	期 間	平成 18 年 9 月 29 日から平成 18 年 10 月 13 日	
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室及び 16 区役所	
		縦覧者数	2 人	
環境影響評価書	提 出	平成 18 年 11 月 24 日		
	縦 覧	期 間	平成 18 年 12 月 1 日から平成 19 年 1 月 4 日	
		場 所	環境局環境都市推進部環境影響評価室及び 16 区役所	
		縦覧者数	5 人	



## 第4章 環境影響の総合的な評価（工事中）

工事中（第1期工事中及び西側施設工事中）における環境影響の総合的な評価について、調査・予測・環境の保全のための措置及び評価の結果の概要一覧は表 4-1～表 4-12 に示すとおりである。

大気質、騒音、振動、水質・底質、地下水、地盤、土壌、動物、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等、温室効果ガス等及び安全性の各項目を総合的にみた場合においても、工事中は環境影響の小さい建設機械の導入や工事関連車両の分散等の適切な工事計画の策定に努めることから、環境影響は低減できるものと判断する。

表 4-1(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(大気質)

項目	調査結果の概要	予測の概要			
		影響要因	予測項目	予測結果	
大気質	<p>[資料調査] 調査対象区域周辺の 大気汚染常時監視測定 局において、二酸化硫 黄、浮遊粒子状物質及び ダイオキシン類は環境基 準及び環境目標値を達 成したが、二酸化窒素 は、環境基準を達成して いるものの環境目標値を 達成していない状況であ った。</p> <p>[現地調査] &lt;一般環境大気質&gt; 調査期間中の調査結 果は、以下のとおりであ り、環境基準の値を下回 っていた。 ・二酸化硫黄 日平均値の最高値: 0.005ppm~0.020ppm 1時間値の最高値: 0.010ppm~0.065ppm ・二酸化窒素 日平均値の最高値: 0.027ppm~0.045ppm ・浮遊粒子状物質 日平均値の最高値: 0.049~0.069 mg/m<sup>3</sup> 1時間値の最高値: 0.069~0.130 mg/m<sup>3</sup> ・ダイオキシン類 0.097~0.16 pg-TEQ/m<sup>3</sup></p> <p>&lt;道路沿道大気質&gt; 調査期間中の調査結 果は、環境基準の値を下 回っていた。 ・二酸化窒素 日平均値の最高値: 0.029ppm~0.053ppm ・浮遊粒子状物質 日平均値の最高値: 0.031~0.087 mg/m<sup>3</sup> 1時間値の最高値: 0.073~0.162 mg/m<sup>3</sup></p>	工 事 中	建設工事	建設作業 による粉じ ん等 (NO <sub>x</sub> 、 SPM)	<p>建設機械の稼働により排出さ れる大気汚染物質の年平均値 の予測の結果、最大着地濃度 が最も大きくなる予測時期は第 1期工事の土木・建築工事時で あり、出現位置は、事業予定地 の南側敷地境界付近と予測さ れる。</p> <p>予測環境濃度は、以下のと おりである。 &lt;第1期工事&gt; ・NO<sub>2</sub>(ppm):0.0371 ・SPM(mg/m<sup>3</sup>):0.0374</p> <p>&lt;西側施設工事&gt; ・NO<sub>2</sub>(ppm):0.0347 ・SPM(mg/m<sup>3</sup>):0.0370</p>
				建設作業 による粉じ ん等 (粉じん)	<p>ビューフォート風力階級に分 類した結果、土壌が飛散する 可能性のある風力階級4以上 の風速は、5%程度と少ないと 予測される。</p> <p>建設作業に伴い発生する粉 じんは、適宜散水を行うことや、 工事関連車両荷台に防塵覆い を行い、また、工事区域に高さ 3mの仮囲いを設置すること により、粉じんの飛散を最小限に 抑えられる。</p>
				工事関連 車両の走 行	自動車排 ガス



表 4-1(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(大気質)

評価の概要																
環境の保全のための措置	評価															
建設工事作業による粉じん等	<p>建設作業による二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測結果は、以下に示すとおりであり、環境基本法に基づく環境基準を下回っており、建設作業による粉じん等(窒素酸化物、浮遊粒子状物質)の大気質への影響は軽微であると考えられる。</p> <p>また、建設作業の実施にあたり、作業待機中は建設機械のアイドリングストップを徹底する等の措置を講じることにより、建設作業による粉じん等(窒素酸化物、浮遊粒子状物質)の環境への影響は低減できるものと判断する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測項目</th> <th>日平均値<sup>※1</sup></th> <th>評価指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">NO<sub>2</sub> (ppm)</td> <td>第1期工事</td> <td>0.0595</td> <td rowspan="2">0.04~0.06のゾーン内、又はそれ以下</td> </tr> <tr> <td>西側施設工事</td> <td>0.0565</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SPM (mg/m<sup>3</sup>)</td> <td>第1期工事</td> <td>0.0838</td> <td rowspan="2">0.10以下</td> </tr> <tr> <td>西側施設工事</td> <td>0.0832</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：日平均値の年間98%値又は2%除外値</p>	予測項目	日平均値 <sup>※1</sup>	評価指標	NO <sub>2</sub> (ppm)	第1期工事	0.0595	0.04~0.06のゾーン内、又はそれ以下	西側施設工事	0.0565	SPM (mg/m <sup>3</sup> )	第1期工事	0.0838	0.10以下	西側施設工事	0.0832
	予測項目	日平均値 <sup>※1</sup>	評価指標													
NO <sub>2</sub> (ppm)	第1期工事	0.0595	0.04~0.06のゾーン内、又はそれ以下													
	西側施設工事	0.0565														
SPM (mg/m <sup>3</sup> )	第1期工事	0.0838	0.10以下													
	西側施設工事	0.0832														
自動車排ガス	<p>掘削工事等により発生した残土を一時保管する場合には、必要に応じ防塵シート等を被せ、粉じんの飛散を防止する。</p> <p>造成裸地については、早期緑化等に努める。</p> <p>工程管理により建設機械の稼働が集中しないようにする。</p> <p>タイヤ洗浄装置を設け、工事関連車両出入りによる粉じんの飛散防止に努める。</p> <p>建設作業に伴い発生する粉じんは、土壌が飛散する可能性がある風速は5%程度と少なく、散水の実施、仮囲いの設置等により、最小限に抑えられることから、建設作業による粉じん等(粉じん)の大気質への影響は軽微であると考えられる。</p> <p>また、建設作業の実施にあたり、一時保管残土の防塵シート掛け、造成裸地の早期緑化等の措置を講じることにより、建設作業による粉じん等(粉じん)の環境への影響は低減できるものと判断する。</p>															
	<p>工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの予測結果は、「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について(答申)」(昭和53年3月、中公審第163号)により提案された環境大気中の二酸化窒素の短期曝露の指針値、及び環境基本法に基づく環境基準を下回っており、工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの大気質への影響は軽微であると考えられる。</p> <p>また、工事の実施にあたっては、工事関連車両の分散化、工事関連車両台数の抑制等の措置を講じることにより、工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの環境への影響は低減できるものと判断する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予測項目</th> <th>予測環境濃度</th> <th>評価指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO<sub>2</sub> (ppm)</td> <td>0.0755~ 0.0921</td> <td>0.1~0.2 以下</td> <td>中央公害対策 審議会答申</td> </tr> <tr> <td>SPM (mg/m<sup>3</sup>)</td> <td>0.121~ 0.162</td> <td>0.20 以下</td> <td>環境基準</td> </tr> </tbody> </table>	予測項目	予測環境濃度	評価指標	NO <sub>2</sub> (ppm)	0.0755~ 0.0921	0.1~0.2 以下	中央公害対策 審議会答申	SPM (mg/m <sup>3</sup> )	0.121~ 0.162	0.20 以下	環境基準				
予測項目	予測環境濃度	評価指標														
NO <sub>2</sub> (ppm)	0.0755~ 0.0921	0.1~0.2 以下	中央公害対策 審議会答申													
SPM (mg/m <sup>3</sup> )	0.121~ 0.162	0.20 以下	環境基準													

表 4-2(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(騒音)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
騒音	<p>[資料調査]</p> <p>港区野跡4丁目の環境騒音は昼間が 58dB、夜間が 53dB でありともに環境基準を上回っている状況であった。</p> <p>港区野跡5丁目の道路交通騒音は昼間 71dB、夜間 64dB であり昼間は環境基準を 1dB 上回っている状況であった。</p> <p>[現地調査]</p> <p>&lt;環境騒音&gt;</p> <p>昼間は平日が、49dB～60dB、休日が 44dB～52dB であった。夜間は平日が 43dB～52dB、休日が 43dB～51dB であった。</p> <p>事業予定地の環境基準の値と比較すると、昼間は全ての地点で環境基準の値(C類型:60dB(昼間)、50dB(夜間))を下回っていたが、夜間は、環境基準の値を上回る地点があった。</p> <p>&lt;道路交通騒音&gt;</p> <p>通常時の休日についてはA地点(汐止交差点付近):66dB、B地点(金城橋交差点付近):67dB、C地点(ニチハ(株)西側道路):62dB の全ての地点で環境基準の値を下回っていた。平日については、A、B地点は72dB と環境基準の値を上回っており、C地点は69dBと環境基準を下回っていた。また、混雑時についてはA地点で71dBと環境基準の値を上回っており、B、C地点では69dB、65dBと環境基準の値を下回っていた。</p>	建設工事	建設作業騒音	<p>&lt;第1期工事&gt;</p> <p>敷地境界で騒音が最も大きくなるのは、土木・建築工事(既設地下構造物撤去)で、南側敷地境界で74dBと予測される。また、敷地境界外で76dBと予測される。</p> <p>&lt;西側施設工事&gt;</p> <p>敷地境界で騒音レベルが最も大きくなるのは、設備工事で、南側敷地境界で71dBと予測される。また、西側道路付近では最大65dB程度と予測される。</p>
		工事中	工事関連車両の走行	道路交通騒音

表 4-2(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(騒音)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事期間は長期にわたるため、実際の工事に当たっては、その際に指定されている最新型の低騒音型の建設機械の積極的な導入に努め、騒音の小さい工法の採用等騒音発生の低減に配慮する。</li> <li>・土木・建築工事(既設地下構造物撤去)は、必要に応じ防音シートを設置する。</li> <li>・特定建設作業以外の建設作業についても特定建設作業の規制基準を遵守する。</li> <li>・建設機械の分散配置に努める。</li> <li>・敷地境界付近では、騒音に対し十分配慮して作業を行う。</li> </ul>	<p>工事区域は高さ3mの仮囲いをする事により、第1期工事に伴う騒音の敷地境界における最大値は74dBと予測される。敷地境界外では最大76dBと予測される。西側施設工事に伴う騒音の敷地境界における最大値は71dB、西側道路付近の最大値は65dB程度と予測される。</p> <p>いずれも、敷地境界の特定作業に伴う騒音の規制基準(85dB)を満足している。さらに、約1.0km離れた最も近い住居地域においては、十分に距離減衰が見込まれるため、建設工事に伴う騒音の影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、低騒音型として指定された建設機械の導入積極的な導入に努め、建設機械の分散配置等の措置を講じることから、建設工事に伴う騒音の影響は低減できるものと判断する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散化に努める。</li> <li>・工事関係者の通勤は、可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制に努める。</li> <li>・建設資材等の搬出入車両については、搬出入量に応じた適切な車種・規格を選定し、工事関連車両の走行台数の抑制に努める。</li> </ul>	<p>路交通騒音は第1ルート(事業予定地の東側を通行するルート)の最大で0.9dB、第2ルート(事業予定地の西側を通行するルート)の最大で1.3dB増加する。環境基準の値と比べると、A、B地点においては全ての時間帯、C地点では一部の時間帯で上回っているが、増加分は1dB程度にとどまると予測され、現況を著しく悪化させないものと判断できるため、工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音の影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散に努めること、工事関係者の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制に努めることにより、工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音の影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-3(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(振動)

項目	調査結果の概要	予測の概要			
		影響要因	予測項目	予測結果	
振動	<p>[資料調査] 港区野跡 5 丁目における道路交通振動は 55dB であった。</p> <p>[現地調査] ＜環境振動＞ 昼間は平日が 38dB～53dB、休日が 30dB 以下～38dB であった。夜間は、平日が 30dB 以下～45dB、休日が 30dB～35dB であった。 振動の感覚閾値(55dB)と比較すると、全ての地点で下回っていた。</p> <p>＜道路交通振動＞ 通常時の平日及び混雑時が 57dB 程度、通常時の休日が 42dB～45dB であった。 L<sub>10</sub> による評価で、いずれの地点とも振動規制法に基づく第二種区域の道路交通振動の要請限度を下回っていた。 通常時の平日と休日と比較した場合、両地点ともに大・中型車の交通量の多い平日が高くなっていた。また、L<sub>10</sub> による評価で、混雑時(休日)の振動レベルは通常時の平日に相当するレベルであった。</p>	工事中	建設工事	建設作業振動	<p>＜第 1 期工事＞ 敷地境界で振動が最も大きくなるのは、土木・建築工事(地下構造物撤去)の南側敷地境界で 71dB と予測される。</p> <p>＜西側施設工事＞ 敷地境界で振動レベルは、土木・建築工事、設備工事ともに 63dB、西側道路付近では、土木・建築工事で最大 54dB 程度と予測される。</p>
			工事関連車両の走行	道路交通振動	<p>第 1 ルート(事業予定地の東側を通行するルート)は、A 地点(汐止交差点付近)において最大 0.3dB、B 地点(金城橋交差点付近)において最大 0.5dB の増加と予測される。第 2 ルート(事業予定地の西側を通行するルート)は C 地点(庄内川付近)において最大 1.0dB、A 地点において 0.2dB の増加と予測される。</p>

表 4-3(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(振動)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事期間は長期にわたるため、実際の工事に当たっては、その際指定されている最新型の低振動型の建設機械の積極的な導入に努め、振動の小さい施工方法の採用等、振動発生の低減に配慮する。</li> <li>・特定建設作業以外の建設作業についても、特定建設作業の規制基準値を遵守する。</li> <li>・建設機械の配置の分散に努める。</li> <li>・工程管理により建設機械の稼働が集中しないようにする。</li> <li>・敷地境界付近での作業時には、振動に対し十分配慮して作業を行うように努める。</li> </ul>	<p>第 1 期工事の敷地境界における最大値は 71dB と予測される。西側施設工事に伴う振動レベルは、敷地境界において最大 63dB であり、西側道路付近では最大 54dB 程度と予測され、敷地境界における特定建設作業に伴う振動の規制基準(75dB)を満足している。さらに、約 1.0km 離れた住居地域においては十分に距離減衰が見込めるため建設工事に伴う振動の影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、振動発生の低減に配慮すること、特定建設作業以外の建設作業についても特定建設作業の規制基準値を遵守すること等により、建設工事に伴う振動の影響は低減できるものと判断する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工程管理により資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散化に努める。</li> <li>・工事関係者の通勤は、可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制に努める。</li> <li>・建設資材等の搬出入車両については、搬出入量に応じた適切な車種・規格を選定し、工事関連車両の走行台数の抑制に努める。</li> </ul>	<p>道路交通振動は第 1 ルート(事業予定地の東側を通行するルート)の最大で 0.5dB、第 2 ルート(事業予定地の西側を通行するルート)の最大で 1.0dB 増加すると予測され、現況に対し著しい影響を与えないものと判断されるため、工事関連車両の走行に伴う道路交通振動の影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散化に努めること、工事関係者の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤車両台数の抑制に努めることにより、工事関連車両の走行に伴う道路交通振動の影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-4(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(水質・底質)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
水質・底質	<p>[資料調査]</p> <p>庄内川(庄内新川橋)の水質は環境基準の値及び環境目標値を満たしていた。</p> <p>名古屋港の水質はCODについて環境基準の値を下回っていた。また、ダイオキシン類は環境基準を達成していた。</p> <p>底質中のダイオキシン類は環境基準の値を下回っていた。</p> <p>[現地調査]</p> <p>放流先排出口の直下における水素イオン濃度は7.4~8.4、溶存酸素量は1.6~9.9 mg/l、化学的酸素要求量は1.0~7.4 mg/lであった。</p> <p>浮遊物質量は4.0~12 mg/lであり、冬季の干潮時の水質は環境目標値を上回ったものの、冬季の満潮時や他の季節については、環境目標値を下回っていた。</p>	工事中	建設工事に伴う排水	<p>&lt;浮遊物質量の放流量&gt;</p> <p>浮遊物質量の放流量は約281kg/日、放流濃度は198mg/lと予測される。</p> <p>&lt;浮遊物質量の拡散範囲&gt;</p> <p>濁水による拡散範囲は放流先から107mであり、この地点で現況水質程度に収まると予測される。</p> <p>&lt;有害物質の放流の濃度&gt;</p> <p>有害物質(鉛、砒素、ほう素及びふっ素)の放流濃度は、特定施設に係る排水基準値を下回っていると予測される。</p>

表 4-4 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(水質・底質)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>• コンクリートミキサー車等の洗浄水は、場外運搬処分する。</li> <li>• 工事排水の濁度及び水素イオン濃度について、簡易測定により常時監視する。</li> <li>• 工事排水量及び放流濃度がより小さく低くなるように排水系統別に処理する等の設計を行う。</li> <li>• 日降水量が 30mm 以上見込まれる場合の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土工事(掘削工)、躯体工事(土木)は中止し、濁水の発生を極力避ける。</li> </ul>	<p>浮遊物質量の放流量は約 281kg/日、放流濃度 198mg/l と予測され、「市民の健康と安全を確保するための環境の保全に関する条例」における建設工事に伴う排水の目安の値 200mg/l を下回る。</p> <p>濁水については、放流先から 107m の地点で現況水質程度に収まると予測される。なお、干潮時の春季、夏季及び秋季は概ね 107m で環境目標値(10mg/l)を下回り、満潮時は概ね 30m で環境目標値を下回る。</p> <p>有害物質の放流濃度については、参考とした「特定施設に係る排水基準値」を下回る。</p> <p>したがって、建設工事に伴う放流先公共用水域の水質への影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、工事排水の濁度及び水素イオン濃度について簡易測定により常時監視するとともに、日降水量が 30mm 以上見込まれる場合の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土工事(掘削工)、躯体工事(土木)は中止し、濁水の発生を極力避ける等の措置を講じることから、建設工事に伴う放流先公共用水域の水質への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-5 (1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(地下水)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
地下水	<p>[資料調査]                      &lt;文献調査&gt;                      事業予定地における定期モニタリングにおいて平成 14 年度から本市が行っている港区空見町における定期モニタリングの結果は、0.019mg/l の砒素が検出されており環境基準の値(0.01mg/l 以下)を上回っていた。</p> <p>&lt;新日本製鐵(株)からの報告&gt;                      新日本製鐵(株)の報告では調査項目全 26 項目中、4 項目(鉛、砒素、ふっ素、ほう素)において環境基準の値を上回っていた。</p> <p>環境基準の値を上回った物質及びその値は、鉛(最大)0.022mg/l、砒素(最大)0.012mg/l、ふっ素(最大)1.2mg/l 及びほう素(最大)2.3mg/l である。なお、地下水が環境基準の値を上回った原因は、「土壌」で示すように人為的原因ではなく、自然的原因によるものと判断した。</p>	<p>建設工事</p> <p>工事中</p>	地下水	<p>地下部の掘削時は掘削部を止水性のある土留め壁等を用い締め切った状態で行い、掘削部底面及び土留め壁等の継ぎ目からしみ出た地下水は工事用ポンプを用い仮設沈砂池へ排出し、「水質」で予測したとおり、適正な処理をしてから公共用水域へ放流する計画であることから、事業予定地及び周辺地下水への浸透はほとんどないと予測される。</p>



表 4-5 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(地下水)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<p>・モニタリングを適宜行い、必要に応じて適切な措置を行う。</p>	<p>地下部の掘削時は、掘削部を止水性のある土留め壁等を用い締め切った状態で行い、しみ出した地下水は適正な処理を行い公共用水域へ放流することから事業予定地内及び事業予定地周辺の地下水への影響は軽微であると考えます。</p> <p>また、モニタリングを適宜行い、必要に応じて適切な措置を講じることから、掘削工事により発生する地下水の事業予定地及び周辺地下水への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-6 (1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(地盤)

項目	調査結果の概要	予測の概要			
		影響要因	予測項目	予測結果	
地盤	<p>[資料調査] 事業予定地は沖積層に位置する。 地盤沈下の状況は揚水規制が開始された昭和49年度以降、地下水位の回復に伴い鈍化傾向を示しており、事業予定地周辺は平成16年度は0.07cm、0.18cm 隆起している状況であった。</p> <p>[現地調査] 砂及び粘性土が複雑に入り組んだ地層を成しており、地表面から地中20m 付近までが堆積年代が新しい沖積層(現代～2万年)、それ以深は堆積年代が古い洪積層(2 万年前)に分類され、Ac2(沖積粘性土)は事業予定地中央付近にレンズ状に介在しており、その他の層は層厚に変化があるもののほぼ水平に堆積している。なお、沖積層のうち表層部 5m 程度は造成による盛土と想定する。</p>	工事中	建設工事	地盤沈下量及び地下水位(周辺地下水の変動)	地下掘削工事では、止水性の高い土留め壁を不透水層に根入れさせるため、土留め壁外側の地下水の流入を抑え、掘削面からしみ出た地下水を工事中排水ポンプで汲み上げる程度であり、周辺地下水の変動はほとんどないと予測される。
				地盤沈下量及び地下水位(周辺地下水の変動に伴う周辺地盤の変位)	大規模な揚水設備の計画はなく、掘削面からしみ出た地下水を工事中排水ポンプで汲み上げる程度であり、掘削工事に伴う地下水変動がほとんどないため、地下水変動に起因する周辺地盤の沈下の影響もほとんどないと予測される。
				地盤沈下量及び地下水位(掘削に伴う周辺地盤の変位)	地下掘削に伴う周辺地盤の変位の影響範囲は、敷地境界から十分に離れており、敷地境界内で影響が留まると予測される。
				地盤沈下量及び地下水位(盛土による周辺地盤の変位)	北側敷地境界では 6.0cm、南側敷地境界では 4.9cm の沈下量で収まるものと予測される。なお、沈下がほぼ完了するまでの経過日数は北側敷地境界で 200 日程度、南側敷地境界で 210 日程度と予測される。

表 4-6 (2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(地盤)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事中は地盤変位と地下水位の観測を定期的に行うことで異常の早期発見に努める。また、必要に応じて影響を遮断・抑制するための対策を講じる。</li> <li>・ 地盤の沈下に関して、直接影響が考えられる事業予定地隣接地権者等と協議を行い、できる限り地盤変位が小さくなるような計画とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周辺地下水の変動                     <p>地下掘削を伴う工事では止水性の高い土留め壁を不透水層まで根入れさせ、掘削面からしみ出た地下水を工事排水ポンプで汲み上げる程度であることから、周辺地下水位への影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、地下水位の定期的な観測等の措置を講じることから、周辺地下水位への影響は低減できるものと判断する。</p> </li> <li>・ 周辺地盤の変位                     <p>掘削工事に伴う地下水変動がほとんどなく、掘削工事に伴い土留め壁の変形に起因する周辺地盤の沈下は、影響範囲が敷地内に十分収まり、敷地内の盛土による周辺地盤の沈下は北側敷地境界で 6.0cm、南側敷地境界で 4.9cm の沈下と予測されるため、地盤沈下への影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、地盤変位の定期的な観測等の措置を講じることから、地盤沈下への影響は低減できるものと判断する。</p> </li> </ul>

表 4-7(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(土壌)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
土壌	<p>[資料調査]                      &lt;新日本製鐵(株)からの報告&gt;                      ア 事業予定地の土地利用の経緯                      事業予定地は愛知県により昭和 2 年から昭和 15 年の間に名古屋港の浚渫土砂で埋め立てられた。昭和 36 年に八幡製鐵(株)名古屋工場(新日本製鐵(株)空見工場)として使用され、昭和 46 年 10 月に一部休止以降現在に至っている。                      操業形態からは土壌汚染に係る物質等の使用の形跡がみられなかった。休止後は倉庫及びモータープール等の用途として使用しており、土壌汚染に係る物質等の使用実績はなかった。</p> <p>イ 土壌の状況                      a. 土壌溶出量                      全 26 項目中、表層調査で 3 項目(鉛、砒素、ふっ素)、深部調査で 4 項目(鉛、砒素、ふっ素、ほう素)が環境基準の値を上回った。                      b. 土壌含有量                      表層調査、深部調査ともに 9 項目全てが全地点とも土壌汚染対策法に基づく土壌含有量基準の値を下回っていた。                      c. 土壌ガス                      11 項目全てが全地点とも検出されなかった。</p>	<p>建設工事</p> <p>工事中</p>	土壌	<p>工事計画より、掘削土砂は、敷地内の盛土材として利用する計画であり、敷地外への搬出はほとんどないが、掘削土砂が盛土材として適さない場合には、残土として掘削土砂を敷地外へ持ち出すこともあるが、その場合には汚染土管理票システムを用い、管理型処分場等で適切に処置をする。したがって、事業予定地内の環境基準の値を上回った土壌が周辺土壌に及ぼす影響はほとんどないものと予測される。</p>

表 4-7(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(土壌)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境基準の値を上回った土壌粒子が混入するおそれのある工事排水は、適切な処理を行い放流する。</li> <li>・残土として場外へ搬出する土量を極力少なくする。</li> <li>・タイヤ洗浄装置を設け、環境基準の値を上回った土粒子の敷地外への飛散を防止する。</li> </ul>	<p>掘削量を極力減らし事業予定地内の盛土材とすることで敷地外への持ち出しを抑えた計画であり、残土として持ち出す場合には、汚染土管理票システムを用い適正に処理をすることにより周辺土壌への影響はほとんどないものとする。</p> <p>また、残土として場外へ搬出する土量を極力少なくすること、タイヤ洗浄装置を設けるなどの措置を講じることで周辺土壌への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-8(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(動物)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
動物	<p>[資料調査]</p> <p>事業予定地周辺に生息する鳥類としては 18 目 38 科 173 種が確認された。</p> <p>水域では「ラムサール条約登録湿地：藤前干潟」が水鳥にとって渡り途中の中継地及び越冬地として極めて重要な場所となっていた。</p> <p>その他の動物としては哺乳類が 4 目 6 科 11 種、は虫類が 2 目 4 科 6 種、両生類が 1 目 2 科 6 種、昆虫類が 16 目 172 科 590 種、クモ類が 1 目 17 科 84 種確認された。</p> <p>[現地調査]</p> <p>鳥類の重要な種は 17 種であり、事業予定地内ではミサゴ及びハヤブサの飛翔が確認された。</p> <p>は虫類、昆虫類及びクモ類の重要な種は事業予定地及び空見緑地等で確認された。</p> <p>また、注目すべき生息地としては事業予定地の西側に隣接する「ラムサール条約登録湿地：藤前干潟」が考えられる。</p> <p>主要な水鳥(サギ類、カモ類、チドリ類及びシギ類)は、調査対象区域の陸域部を利用するものはごくわずかであった。</p> <p>11 種の繁殖及び繁殖兆候が確認された。事業予定地では繁殖及び繁殖兆候は確認されなかった。</p>	<p>建設工事及び工事関連車両の走行</p> <p>工事中</p>	<p>鳥類への影響(建設工事(大気質)の鳥類(水鳥)への影響)</p>	<p>大気質の予測結果からラムサール条約登録湿地の大気質寄与濃度(年平均値)は、現況濃度に対して相当程度小さいことから、現況の状態との変化の程度は軽微と考えられる。環境の変化による一時的な忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく変えるものではなく、鳥類(水鳥)への影響は小さいと予測される。</p>
			<p>鳥類への影響(建設工事(騒音)の鳥類(水鳥)への影響)</p>	<p>建設作業騒音の予測結果から西側敷地境界付近では第 1 期工事で 60dB 程度、西側施設工事で 65dB 程度と予測される。</p> <p>ラムサール条約登録湿地方向への伝搬は距離減衰が見込まれることから、現況の状態との変化の程度は軽微と考えられる。</p> <p>環境の変化による一時的な忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく変えるものではなく、鳥類(水鳥)への影響は小さいと予測される。</p>
			<p>鳥類への影響(建設工事(振動)の鳥類(水鳥)への影響)</p>	<p>建設作業振動の予測結果から西側敷地境界付近では第 1 期工事で 30dB 未満、西側施設工事で 50dB 程度と予測される。</p> <p>ラムサール条約登録湿地方向への伝搬は距離減衰が見込まれることから、現況の状態との変化の程度は軽微と考えられる。</p> <p>環境の変化による一時的な忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく変えるものではなく、鳥類(水鳥)への影響は小さいと予測される。</p>
			<p>鳥類への影響(工事関連車両の走行の鳥類(水鳥)への影響)</p>	<p>工事関連車両の走行に伴う大気質、騒音及び振動の予測結果から、ラムサール条約登録湿地の寄与濃度及び予測結果は、現況の状態との変化の程度は軽微と考えられる。</p> <p>環境の変化による一時的な忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく変えるものではなく、鳥類(水鳥)への影響は小さいと予測される。</p>

表 4-8(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(動物)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業待機中は建設機械を停止するなど、アイドルングストップを徹底する。</li> <li>・ 建設機械の配置の分散に努める。</li> <li>・ 最新型の低騒音型・低振動型の機械の積極的な導入に努め、騒音・振動の小さい工法を採用する等、騒音・振動の発生の低減に配慮する。</li> </ul>	<p>大気質、騒音及び振動の現況との変化の程度は軽微と考えられる。環境の変化による一時的な忌避行動は否定できないが、生息環境を大きく変えるものではなく、工事中の鳥類(水鳥)への影響の程度は小さいと考える。</p> <p>また、作業待機中は建設機械を停止するなど、アイドルングストップを徹底し、建設機械の配置の分散に努め、騒音・振動の小さい建設機械や工法を採用する等、騒音・振動の発生の低減に配慮することから、工事中の鳥類(水鳥)への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-9(1-1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(人と自然との触れ合いの活動の場)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
人と自然との触れ合いの活動の場	<p>[資料調査]</p> <p>事業予定地周辺には主要な触れ合いの活動の場として、「空見緑地」、「稲永公園」、「野鳥観察館」、「稲永ビジターセンター」が存在する。</p> <p>ア 稲永公園 事業予定地の北約1kmに位置する。芝生広場、港サッカー場、野球場、河口修景広場、木製遊具広場、野鳥観察館及び稲永ビジターセンター(平成17年3月27日開館)等が整備されていた。</p> <p>イ 空見緑地 事業予定地の北東約100m、「あおなみ線(西名古屋港線)」の高架東側に位置する。面積は全体で約1.5haであり、このうち植栽は約63%であった。</p> <p>[現地調査]</p> <p>ア ラムサール条約登録湿地 事業予定地西側水域は、ラムサール条約登録湿地として指定されている。 事業予定地西側護岸では、バードウォッチングを楽しんでいる人を確認することがあった。 また、まばらではあるが、釣りを楽しんでいる人も確認することがあった。</p>	建設工事及び工事関連車両の走行	触れ合いの活動の場での環境への影響	<p>&lt;事業予定地西側護岸&gt; 「大気質、騒音及び振動」の環境影響については、それぞれの予測結果から類推すると、事業予定地からの距離減衰が期待でき、工事関連車両を分散させる走行ルートを選定及び工程管理を徹底することから、西側護岸での環境影響の程度は小さいと予測される。また、西側護岸からのバードウォッチングに関しては、工事中の鳥類への影響の程度は小さいことから類推すると、利用状況の変化はほとんどないと予測される。</p> <p>&lt;稲永公園&gt; 「大気質、騒音及び振動」の環境影響については、それぞれの予測結果から類推すると、事業予定地から十分に距離が離れており、工事関連車両を分散させる走行ルートを選定及び工程管理を徹底することから、環境影響の程度は小さいと予測される。よって、公園散策、散歩、休憩等の利用状況の変化はほとんどないと予測される。また、野鳥観察館、稲永ビジターセンター、護岸からのバードウォッチングに関しては、工事中の鳥類への影響の程度は小さいことから類推すると、利用状況の変化はほとんどないと予測される。</p> <p>&lt;空見緑地&gt; 「大気質、騒音及び振動」の環境影響については、それぞれの予測結果から類推すると、事業予定地からの距離減衰が期待でき、工事関連車両を分散させる走行ルートを選定及び工程管理を徹底することから、空見緑地での環境影響の程度は小さいと予測される。よって、公園散策、散歩、休憩等の利用状況の変化はほとんどないと予測される。</p>
	工事中			



表 4-9(2-1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(人と自然との触れ合いの活動の場)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<p>・各環境要素で示した環境の保全のための措置を講じる。</p>	<p>事業予定地西側護岸、稲永公園及び空見緑地での大気質、騒音、振動及び動物の環境影響の程度は小さく、公園散策、散歩、休憩、バードウォッチング等の利用状況の変化はほとんどないと予測されることから、工事中の触れ合いの活動の場の環境への影響及び利用状況に与える影響は軽微であると考えます。</p> <p>また、各環境要素で示した環境の保全のための措置を講じることにより、工事中の触れ合いの活動の場への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-9(1-2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(人と自然との触れ合いの活動の場)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
人と自然との触れ合いの活動の場	<p>イ 稲永公園</p> <p>年間を通じて、午前中は散歩、散策、ジョギング等の利用が多かった。また、遊具等の利用、休憩等、集団での散歩・散策コースにも利用されている状況であった。</p> <p>公園の西側護岸では、春季から秋季にかけて釣りを楽しんでいるのを確認することもあった。</p> <p>また、バードウォッチングの利用もあり、併せて野鳥観察館や稲永ビジターセンターでの個人や集団での利用が盛んであった。</p> <p>施設利用以外の目的での長時間利用は、あまりみられなかった。</p>	工事中	前述のとおり	前述のとおり
	<p>ウ 空見緑地</p> <p>春季から秋季の間の昼食時に昼食、休憩等に利用することを確認した。全般には利用がほとんどない状況であった。</p>		前述のとおり	前述のとおり

表 4-9(2-2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(人と自然との触れ合いの活動の場)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
前述のとおり	前述のとおり

表 4-10(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(廃棄物等)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
廃棄物等	<p>[資料調査]</p> <p>ア 廃棄物発生の状況 平成 15 年度に発生した焼却灰は 17,827t(山崎:3,896t、柴田:5,539t、宝神:8,392t)であった。 平成 15 年度のし渣・沈砂発生量は、12,414t/年であった。</p> <p>イ 廃棄物の管理・減量化・再利用の状況 焼却灰は土質改良材やセメント原料等に有効利用されている。有効利用率は 89.4%(15,934t)であった。 し渣・沈砂の有効利用率は 36.9%(4,586t)であった。</p>	建設工事	廃棄物等の種類及び発生量の程度	<p>&lt;廃棄物の種類及び発生量&gt; 工事計画より、廃棄物の種類及び発生量は、鉄くず 1,100t、コンクリートがら 41,000m<sup>3</sup>、アスファルトがら 13,000m<sup>3</sup>、建設汚泥 7,000m<sup>3</sup>、その他(松杭等)1,600tと予測される。</p> <p>&lt;廃棄物の排出抑制、減量化、再利用、リサイクル等の方策及び量&gt; 廃棄物の排出抑制、減量化、再利用、リサイクル等の方策は以下に示すとおりである。これらの方策を行うことにより、廃棄物の発生を最小限にできるものと予測される。</p> <p>a. 建設汚泥 できる限り再資源化に努める。</p> <p>b. コンクリート・アスファルトがら 100%再資源化に努める。</p> <p>c. 金属くず 分別を徹底し、可能な限り再資源化することに努める。</p> <p>d. その他(松杭等) 分別を徹底し、可能な限り有効利用に努める。</p> <p>&lt;残土の発生量、再利用・リサイクル等の方策及び量&gt;</p> <p>a. 残土の発生量 工事計画から、掘削等による残土は約 137,000m<sup>3</sup>と予測される。</p> <p>b. 残土の再利用・リサイクル等の方策及び量 工事計画から、盛土量は約 162,000m<sup>3</sup> 必要となり、掘削土砂は極力、盛土材として再利用される。</p>

表 4-10(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(廃棄物等)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化に係る法律」(平成 12 年 法律第 104 号)、「あいち建設リサイクル指針」(平成 14 年 3 月 愛知県)、「第 2 次名古屋市内環境保全率先行動計画」(平成 14 年 7 月)に基づき、再資源化に努める。</li> <li>・廃棄物等の処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年 法律 137 号)等の関係法令を遵守し適切に処理を行う。</li> <li>・盛土材として使用できない場合は、場外搬出し、運搬途中の取扱に十分な配慮をするとともに、汚染土管理票システムを用いた適正な管理を図る。</li> <li>・資材の梱包材を簡素化し、廃棄物の発生を抑制に努める。</li> <li>・残材料が発生しないような資材搬入計画の作成に努める。</li> </ul>	<p>建設時に発生する廃棄物については、再資源化に努め、残土(建設発生土)は、極力、盛土材として再利用することにより建設時に発生する廃棄物等の環境への影響は軽微であると考えます。</p> <p>また、廃棄物を「建設工事に係る資材の再資源化に係る法律」(平成 12 年 法律第 104 号)、「あいち建設リサイクル指針」(平成 14 年 3 月 愛知県)、「第 2 次名古屋市内環境保全率先行動計画」(平成 16 年 4 月)に基づき、リサイクルに努める等の措置を講じることから、建設工事に伴う廃棄物等の影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-11(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(温室効果ガス等)

項目	調査結果の概要	予測の概要			
		影響要因	予測項目	予測結果	
温室効果ガス等	<p>[資料調査] 平成 15 年度における山崎汚泥処理場、柴田汚泥処理場、宝神汚泥処理場から発生する二酸化炭素等排出量を算定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・山崎汚泥処理場 二酸化炭素 10,023.7(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化炭素 0.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化二窒素 70.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N)</li> <li>・柴田汚泥処理場 二酸化炭素 13,257.2(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化炭素 0.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化二窒素 56.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N)</li> <li>・宝神汚泥処理場 二酸化炭素 5,044.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化炭素 54.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N) 一酸化二窒素 14.0(10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>N)</li> </ul>	工事中	建設工事及び工事関連車両の走行	温室効果ガス等の排出の程度	工事中には約 12,750t(二酸化炭素換算値)の温室効果ガスが発生するものの、省エネルギー型の建設機械の使用に努めるため、温室効果ガスの発生は最小限に抑えられるものと予測される。

表 4-11(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(温室効果ガス等)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業待機中は建設機械を停止するなど、アイドリングストップを徹底する。</li> <li>・通勤時にはエコドライブに努める。</li> <li>・高炉セメントの使用に努める。</li> <li>・森林資源の保護などに留意して合板型枠の使用を抑制する。</li> <li>・工事計画を適切に立て、建設資材の効率的な搬入搬出に努める。</li> </ul>	<p>建設工事に伴い発生する温室効果ガス総排出量は約 12,750t(二酸化炭素換算値)発生するものの、省エネルギー型の建設機械の使用に努めるため発生量は最小限に抑えられているものと予測されることから、温室効果ガスの環境への影響は軽微であると考えます。</p> <p>また、建設機械のアイドリングストップを徹底することや、高炉セメントの使用に努めることなどの対策を講じることから、建設工事に伴う温室効果ガスの環境への影響は低減できるものと判断する。</p>

表 4-12(1) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(安全性)

項目	調査結果の概要	予測の概要		
		影響要因	予測項目	予測結果
安全性	<p>[資料調査]</p> <p>事業予定地の東側に隣接して主要地方道「金城埠頭線」が南北に整備され、これを南下すると国道「302号線」に接続している。北上すると県道「港中川線」、市道「稲永埠頭線」に接続する。その北側には東西方向に国道「23号線」が整備されている。</p> <p>また、調査対象区域を含む野跡学区の交通事故発生件数は、平成16年で22件であった。</p> <p>[現地調査]</p> <p>ア 交通量</p> <p>歩行者は、汐止町交差点が金城橋交差点よりも多く、また、全体交通量に対する歩行者・自転車の占める割合も大きい。また、事業予定地周辺は、ほとんど歩行者がいない状況であった。</p> <p>イ 交通安全設備の確認</p> <p>事業予定地西側の道路は中央分離帯のある片側2車線の道路が整備されており道路西側の海側に歩道が整備されていたが、東側には歩道が整備されていなかった。</p> <p>事業予定地北側の道路は、道路北側の歩道帯が縁石により分離されており、南側には歩道が整備されていなかった。</p> <p>事業予定地東側の主要地方道金城埠頭線は、中央分離帯のある片側3車線道路であり、道路両端に歩道が整備されていた。また、事業予定地前には横断歩道が整備され、バス停が設置されていた。</p>	<p>工</p> <p>事</p> <p>関</p> <p>連</p> <p>車</p> <p>両</p> <p>の</p> <p>走</p> <p>行</p> <p>工</p> <p>事</p> <p>中</p>	<p>交</p> <p>通</p> <p>安</p> <p>全</p> <p>等</p> <p>へ</p> <p>の</p> <p>影</p> <p>響</p>	<p>往</p> <p>路</p> <p>第</p> <p>1</p> <p>ル</p> <p>ー</p> <p>ト</p> <p>(</p> <p>事</p> <p>業</p> <p>予</p> <p>定</p> <p>地</p> <p>の</p> <p>東</p> <p>側</p> <p>を</p> <p>通</p> <p>行</p> <p>す</p> <p>ル</p> <p>ー</p> <p>ト</p> <p>)</p> <p>走</p> <p>行</p> <p>時</p> <p>に</p> <p>お</p> <p>い</p> <p>て</p> <p>、</p> <p>大</p> <p>型</p> <p>車</p> <p>と</p> <p>歩</p> <p>行</p> <p>者</p> <p>等</p> <p>の</p> <p>交</p> <p>錯</p> <p>が</p> <p>最</p> <p>も</p> <p>多</p> <p>い</p> <p>箇</p> <p>所</p> <p>は</p> <p>、</p> <p>C</p> <p>地</p> <p>点</p> <p>(</p> <p>庄</p> <p>内</p> <p>川</p> <p>付</p> <p>近</p> <p>)</p> <p>で</p> <p>あ</p> <p>り</p> <p>、</p> <p>そ</p> <p>の</p> <p>発</p> <p>生</p> <p>集</p> <p>中</p> <p>台</p> <p>数</p> <p>は</p> <p>、</p> <p>47</p> <p>台</p> <p>/</p> <p>時</p> <p>と</p> <p>予</p> <p>測</p> <p>さ</p> <p>れ</p> <p>る</p> <p>。</p> <p>ま</p> <p>た</p> <p>、</p> <p>朝</p> <p>夕</p> <p>の</p> <p>通</p> <p>勤</p> <p>時</p> <p>に</p> <p>は</p> <p>乗</p> <p>用</p> <p>車</p> <p>の</p> <p>ピー</p> <p>ク</p> <p>と</p> <p>な</p> <p>り</p> <p>、</p> <p>そ</p> <p>の</p> <p>発</p> <p>生</p> <p>集</p> <p>中</p> <p>台</p> <p>数</p> <p>は</p> <p>、</p> <p>全</p> <p>て</p> <p>の</p> <p>地</p> <p>点</p> <p>で</p> <p>126</p> <p>台</p> <p>/</p> <p>時</p> <p>と</p> <p>予</p> <p>測</p> <p>さ</p> <p>れ</p> <p>る</p> <p>。</p> <p>往</p> <p>路</p> <p>第</p> <p>2</p> <p>ル</p> <p>ー</p> <p>ト</p> <p>(</p> <p>事</p> <p>業</p> <p>予</p> <p>定</p> <p>地</p> <p>の</p> <p>西</p> <p>側</p> <p>を</p> <p>通</p> <p>行</p> <p>す</p> <p>ル</p> <p>ー</p> <p>ト</p> <p>)</p> <p>走</p> <p>行</p> <p>時</p> <p>に</p> <p>お</p> <p>い</p> <p>て</p> <p>、</p> <p>B</p> <p>、</p> <p>C</p> <p>地</p> <p>点</p> <p>(</p> <p>金</p> <p>城</p> <p>橋</p> <p>交</p> <p>差</p> <p>点</p> <p>付</p> <p>近</p> <p>、</p> <p>庄</p> <p>内</p> <p>川</p> <p>付</p> <p>近</p> <p>)</p> <p>で</p> <p>歩</p> <p>行</p> <p>者</p> <p>等</p> <p>と</p> <p>交</p> <p>錯</p> <p>し</p> <p>、</p> <p>そ</p> <p>の</p> <p>最</p> <p>大</p> <p>発</p> <p>生</p> <p>集</p> <p>中</p> <p>台</p> <p>数</p> <p>は</p> <p>大</p> <p>型</p> <p>車</p> <p>で</p> <p>24</p> <p>台</p> <p>/</p> <p>時</p> <p>、</p> <p>乗</p> <p>用</p> <p>車</p> <p>は</p> <p>126</p> <p>台</p> <p>/</p> <p>時</p> <p>と</p> <p>予</p> <p>測</p> <p>さ</p> <p>れ</p> <p>る</p> <p>。</p>



表 4-12(2) 調査・予測・評価の結果の概要一覧(安全性)

評価の概要	
環境の保全のための措置	評 価
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通勤車両、資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散に努める。</li> <li>• 工事関連車両の運転者に対しては、交通規則の遵守及び安全運転の徹底を図る。</li> <li>• 工事関連車両の主要な出入口は、交通整理員を配置し、歩道での歩行者の安全を確保する。なお、危険のないように路面の段差への配慮等の対策を講じる。</li> <li>• 道路占有に関して作業区域は防護さく等で囲み、範囲を明確にする。</li> </ul>	<p>往路第 1 ルート走行時は、大型車の最大発生集中台数は 47 台/時、乗用車の最大発生集中台数は 126 台/時と予測される。また、往路第 2 ルート走行時は、大型車の最大発生集中台数は 24 台/時、乗用車の最大発生集中台数は 126 台/時と予測される。</p> <p>したがって、工事予告表示等は警察等と協議を行い、道路利用者が遠方より確認・迂回する事ができるような場所に設置することから、工事関連車両の走行に伴う交通安全等への影響は軽微であると考ええる。</p> <p>また、工事関連車両の走行ルートを 2 ルートに分散し、工事関連車両の運転者に対しては交通規則の遵守及び安全運転の徹底を図り、工事関連車両の主要な出入口には交通整理員を配置する等の措置を講じることから、工事関連車両の走行に伴う交通安全等への影響は低減できるものと判断する。</p>



## 第5章 事後調査

### 1 事後調査の目的

本事業の実施により周辺環境に及ぼす影響について把握し、予測・評価及び環境保全措置の内容の妥当性を検証することを目的とする。

また、事業実施に際して、事前配慮の内容及び環境保全措置の内容について、具体的にどのように反映したのかについても併せて報告を行うこととする。

### 2 事後調査計画（工事中）

本調査で対象とする環境影響要因は第1期工事及び西側施設工事である。

事後調査の項目、手法並びに時期及び期間は表5-1～表5-2に示すとおりである。

なお、要望・苦情等があった場合は、その件数、内容及び対応についても併せて報告する。

表 5-1 事後調査計画(工事中)

	調査項目	調査方法
大 気 質	【建設作業による粉じん等】 窒素酸化物	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法またはオゾンを用いる化学発光法(JIS B 7953)による24時間連続測定
	【建設作業による粉じん等】 浮遊粒子状物質	β線吸収法(JIS B7954)による24時間連続測定
	【建設作業による粉じん等】 粉じん	ハイボリュームエアサンプラー等による試料採取及び重量分析法
	【自動車排ガス】 工事関連車両の走行台数	工事記録からの読みとり及び運転者へのルート確認
騒 音	【建設作業騒音】 騒音レベル	「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年 厚生省・建設省告示第1号)に定める方法
	【道路交通騒音】 騒音レベル	「騒音に係る環境基準について」(平成10年 環境庁告示第64号)に定める方法
振 動	【建設作業振動】 振動レベル	「振動規制法施行規則」(昭和51年 総理府令第58号)別表第1に定める方法
	【道路交通振動】 振動レベル	JIS Z8735「振動レベル測定方法」に定める方法
水 質	【建設工事に伴う排水の程度】 水素イオン濃度、濁度、浮遊物質、鉛、砒素、ほう素及びふっ素	「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)で定める方法及び簡易測定

調査地点	調査時期	備考
事業予定地敷地境界付近の代表地点(1地点)	第1期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働台数が最大となると考えられる1年間(土木・建築工事)のうち4季(各1週間)	調査時の建設機械の型式、配置、稼働状況及び作業状況についても併せて報告する。
事業予定地敷地境界付近の代表地点(1地点)	第1期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働台数が最大となると考えられる1年間(土木・建築工事)のうち4季(各1週間)	調査時の建設機械の型式、配置、稼働状況及び作業状況についても併せて報告する。
事業予定地敷地境界付近の代表地点(1地点)	第1期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働台数が最大となると考えられる1年間(土木・建築工事)のうち4季(各1週間)	調査時の建設機械の型式、配置、稼働状況及び作業状況についても併せて報告する。
各出入り口(3地点)	第1期工事の工事関連車両の走行が最大となる時期(土木・建築工事)のうち1日	工事関連車両の走行に伴う大気質の影響は軽微であるため、走行台数を調査する。
事業予定地の敷地境界代表地点(4地点)の地上高さ1.2mの地点	第1期工事:土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼働台数が最大となる時期のうち各1日(建設作業振動と同時)。 西側施設工事:土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼働台数が最大となる時期のうち各1日(建設作業振動と同時)。	調査時の建設機械の型式、配置、稼働状況及び作業状況についても併せて報告する。
事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点	第1期工事の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両の走行台数が最大となる時期のうち各1日(道路交通振動と同時)。	交通量調査も併せて行う。
事業予定地の敷地境界代表地点(4地点)	第1期工事:土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼働台数が最大となる時期のうち各1日(建設作業騒音と同時)。 西側施設工事:土木・建築工事、設備工事の建設機械の稼働台数が最大となる時期のうち各1日(建設作業騒音と同時)。	調査時の建設機械の型式、配置、稼働状況及び作業状況についても併せて報告する。
事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点	第1期工事の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両の走行台数が最大となる時期のうち各1日(道路交通騒音と同時)	交通量調査も併せて行う。
敷地内の排水出口(1地点)	○水素イオン濃度、濁度 排水期間中(簡易測定による連続測定) ○水素イオン濃度、濁度、浮遊物質、鉛、砒素、ほう素及びふっ素 建設工事のうち排水期間中(1回/月)	

表 5-2 事後調査計画(工事中)

	調 査 項 目	調 査 方 法
地下水	【地下水の水質の程度】 鉛、砒素、ほう素及びふっ素	「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年度環境庁告示第10号)に定める方法
地盤	【地盤沈下の程度】 地盤変位の状況、地下水位の状況	水準点測量、観測井等による地下水位の確認
土壌	【有害物質の土壌への負荷の程度】 有害物質の種類、環境基準超過土壌の処理方法、処理量及び環境基準超過の程度	○環境基準超過土壌の処理方法及び処理量 工事記録の読みとり及び汚染土管理票の整理  ○有害物質の種類、環境基準超過の程度 「土壌汚染等対策指針」(平成15年 名古屋市告示第413号)に基づく方法
動物	【動物(鳥類)への影響】 陸生動物(鳥類)の動物相の状況、陸生動物(鳥類)の重要な種の状況	「自然環境アセスメント技術マニュアル」(1995年 (財)自然環境研究センター)に準拠  ○鳥 類 ポイントセンサス調査、任意直接観察調査 湿地に生息する鳥類の事業予定地周辺の利用状況調査
廃棄物等	【廃棄物等の発生の程度】 建設廃棄物等の発生量、建設廃棄物等の再資源化の状況	工事記録からの読みとり等
温室効果ガス等	【温室効果ガス等の発生の程度】 二酸化炭素	工事記録から建設機械及び工事関連車両の種類及び稼働台数を整理し、推計する。
安全性	【交通安全等への影響】 工事関連車両の走行台数及び交通安全措置の状況	工事記録及び現地確認により、発生集中交通台数及び歩行者、自転車数を整理する。また、交通安全設備等の設置状況を確認する。
	【交通の状況】 交通量	○自動車交通量 数取器を使用し連続して交通量を調査する。 車種分類は、小型車類(乗用車、小型貨物車)、大型車類(普通貨物車、バス)とする。  ○歩行者交通量 数取器を使用し連続して調査する。

調査地点	調査時期	備考
掘削部代表 6 地点(既設地下構造物、受泥棟、第 1 汚泥棟、受電棟、返流水処理施設及び焼却炉棟)	建設工事のうち排水前に 1 回及び排水期間中 1 回/月	
敷地境界付近の 4 地点	建設工事のうち地盤沈下がほぼ完了する時期(盛土完了後約 210 日程度)まで(1 回/月)	
工事区域内	建設工事中(掘削工事)	
事業予定地西側護岸、稲永公園、空見緑地及び調査対象区域(陸域部)も調査範囲とする。	第 1 期工事及び西側施設工事の建設機械の稼働台数が最大となると考えられる 1 年間のうち 4 季	
工事区域内	工事期間中	
事業予定地及びその周辺	工事期間中	
事業予定地出入口部 3 箇所	第 1 期工事の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事、設備工事の工事関連車両の走行台数が最大となると考えられる時期のうち各 1 日	
事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道 3 地点及び事業予定地東側歩道	<p>第 1 期工事の土木・建築工事(既設地下構造物撤去)、土木・建築工事及び設備工事の工事関連車両の走行台数が最大となると考えられる以下の時期</p> <p>○通常時 国際展示場で催事が行われていない平日と休日(日・祝日)について各 1 日 朝 6 時から 22 時まで</p> <p>○混雑時 国際展示場で催事が行われている休日(日・祝日)について 1 日 朝 6 時から 22 時まで</p>	ASJ モデル 2003 で使用できる分類で調査を行う





## 参考資料

評価書時点における施設計画及び配置計画は、以下のとおりである。

### 1. 施設計画

施設の概要は表 1 に示すとおりである。

施設は、機能毎に別棟とし、受泥棟、汚泥棟、焼却炉棟、返流水処理施設、管理棟、受電・ポンプ棟、し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟及び熱利用棟を計画する。

汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用途を検討し、熱の有効利用を図ることとする。

なお、し渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟のみ昼間運転とし、それ以外の施設は 24 時間稼働である。

表 1 施設の概要

項目	施設の概要	施設の形状寸法	
		第 1 期施設供用時	本施設全体供用時
受泥棟	汚泥の受入、貯留を行う施設	平面:57m×45m 断面:高さ 22m	平面:100m×45m 断面:高さ 22m
第 1 汚泥棟	汚泥の濃縮及び脱水を行う施設	平面:146m×45m 断面:高さ 31m	
第 2 汚泥棟	同上	—	平面:146m×45m 断面:高さ 31m
第 1 焼却炉棟	脱水汚泥を焼却する施設	平面:63m×83m 断面:高さ 30m	平面:133m×83m 断面:高さ 30m
第 2 焼却炉棟	同上	—	平面:133m×83m 断面:高さ 30m
返流水処理施設	返流水を凝集沈殿法により処理する施設	平面:40m×86m 断面:高さ 8m (地下 12m)	平面:82m×86m 断面:高さ 8m (地下 12m)
受電・ポンプ棟	本施設の受電を行う施設であり、併せて処理した返流水を宝神下水処理場へ送水するポンプ設備を有する施設	平面:63m×33m 断面:高さ 15m(地下 17m)	
熱利用棟	汚泥焼却により発生する熱を利用する施設	平面:51m×29m 断面:高さ 18m	
し渣洗浄棟	本施設及び各下水処理場等から発生するし渣を洗浄脱水する施設	—	平面:30m×50m 断面:高さ 20m
沈砂洗浄棟	本施設及び各下水処理場等から発生する沈砂を洗浄する施設	—	平面:48m×50m 断面:高さ 20m
管理棟	本施設の運転管理を行う施設	平面:50m×36m 断面:高さ 19m	

### 2. 配置計画

配置計画は、図 1(1)～(2)に示すとおりである。

配置計画は、当初計画を見直し、以下に示す内容を変更した。これにより、機能の合理化、建設コストを含めたトータルコストの低減を図る。

- ・ 返流水処理方式について、コスト、維持管理性の観点から、水処理方式の見直しを行った。その結果、施設がよりコンパクトとなった。
- ・ 汚泥棟への送泥距離を短くし、維持管理上のリスクを軽減するため、受泥棟を第1汚泥棟と第2汚泥棟の間に配置替えした。
- ・ 周辺環境対策に配慮し、臭気の漏洩が懸念されるし渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟を敷地中央部にあたる第1焼却炉棟と第2焼却炉棟の間に配置替えした。
- ・ 熱利用効率を高める観点から、新たに熱利用棟を設け、最短の動線で熱回収が可能な第1焼却炉棟と第2焼却炉棟の間に配置した。

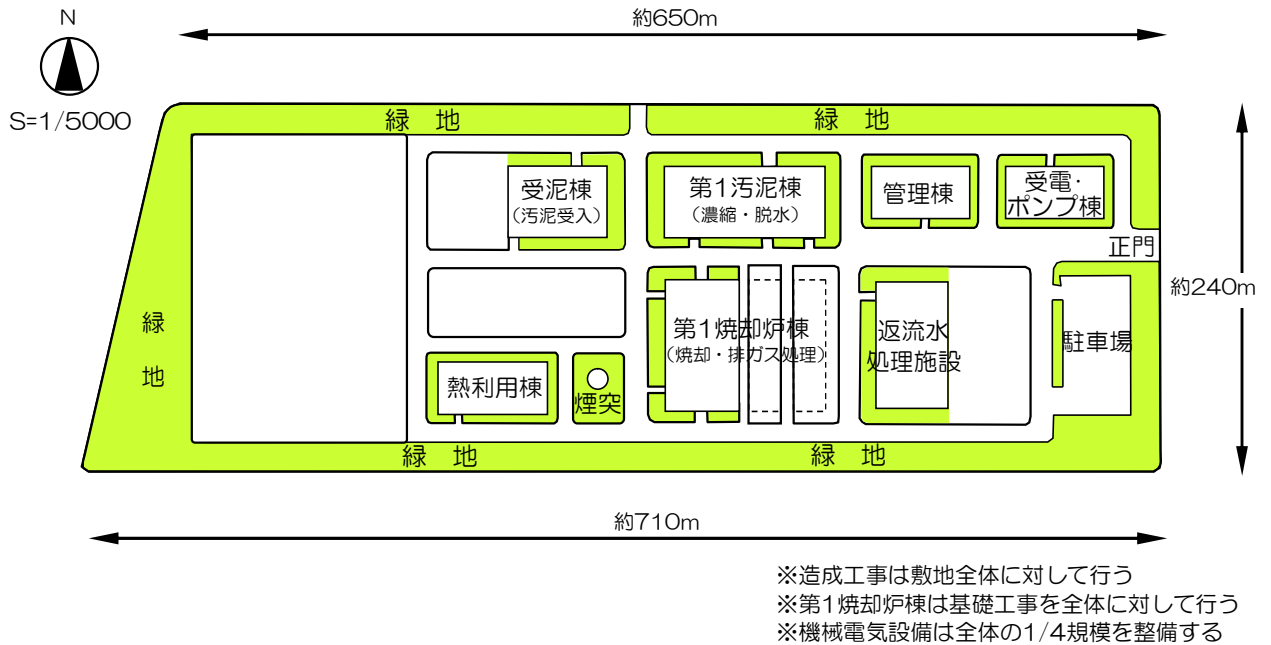


図 1(1) 第 1 期施設配置計画

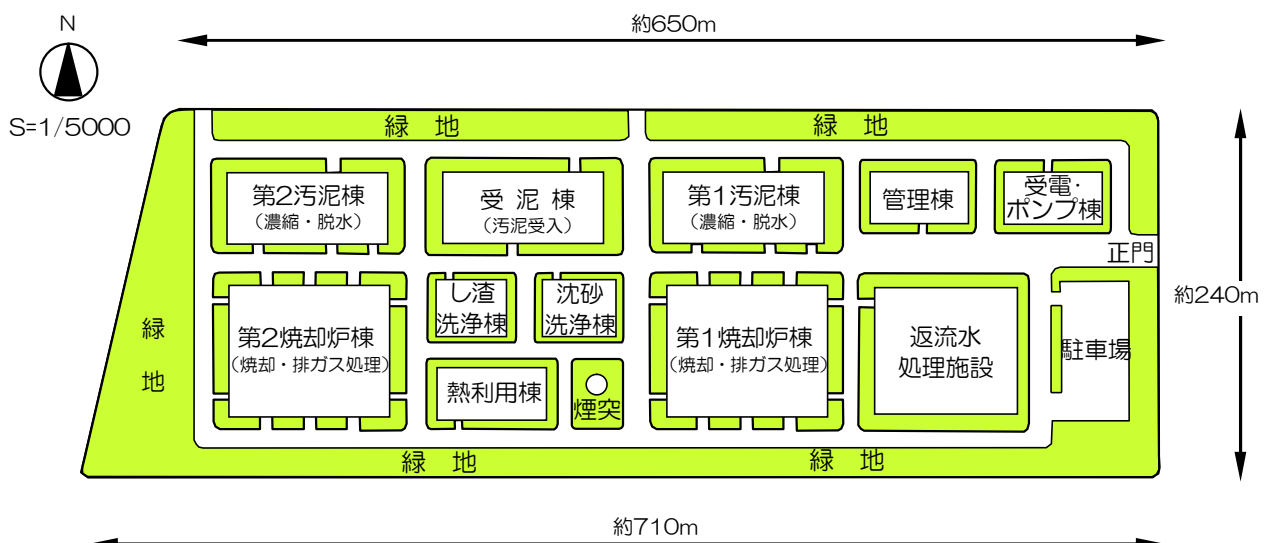


図 1(2) 全体施設配置計画
