

○インスペクターからのコメント(77回)

今日は、外はちょっと寒いけれど、森の中に入ると少し暖かくて、木漏れ日があって、こういう里山を散策するにはめったにない良い天気で、ずいぶん楽しませて頂きました。今回は学びの時間で今までのデータの比較があったので、非常に分かりやすかったと思います。浸食状況については、測量してみるとそれほど浸食しておらず、以前の活動で皆で力を合わせて補修した所が有効に効いていることが分かりました。こうやって自然を愛でたり、活動したりというの、なかなか良い機会です。息長く続けていけたらいいと思います。

岡村
インスペクター

自然というのは非常に時間がかかるもので、経年変化を見てみても、どれだけ変わったんだろう？というくらい、変化が遅いですね。本当に長い時間が掛かります。今日も時間のない中で、少人数で剪定をしましたが、本来は何日もかかる作業です。まだこれからも大変ですが、皆さん頑張ってください。

大竹
インスペクター

今回はとても良いお天気で、シェルターの所に行ったら、オオムカデの仲間を見つけました。こういう生きものがあの中にいるよということを、皆さん、心で想像してほしいな、と思います。道路の影響は決してゼロではないと思うので、そうであれば、より良いものをつくっていかねばならないと思います。また、オドリコソウのような日本にしかない在来の植物も、高木と同様にここで守っていけるような地点を増やしていけたら良いと思います。

長谷川
インスペクター

◇フィールドワーク3～交通グループ～

検証委員会の課題で挙げられていた歩道と散策路の接続について検討しました。

散策路（緑地）と歩道（道路）が接続する候補地5か所を現地で実際に確認しました。



歩道と散策路が接する高さを確認しました。



それぞれの候補地をチェックして課題を抽出しました。



◇維持管理工事のお知らせ

工事区域の維持管理工事の状況をお知らせします。シェルター構造内の落書きを落とし、塗料を塗る作業を行います。

工 事 名 市道弥富相生山線第4号壁面補修工事
工事期間 平成25年3月6日～平成25年3月29日
工事内容 シェルター構造物内の塗装工事

連絡先

名古屋市天白土木事務所
TEL 052-803-6644 FAX 052-805-1594
整備係長 平手 利彦 / 担当者 倉田 三恵子
株式会社 愛知シンコー
TEL 052-698-1523 FAX 052-694-1203
現場代理人 下元 清文

※落書きについては1月11日付けで天白警察署に被害届を提出しています。
この件について目撃された方は下記問い合わせ先までご連絡下さい。

問い合わせ先

名古屋市 緑政土木局 道路建設部 道路建設課内 「環境に配慮した道づくり」施工ワーキング事務局
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話：052-972-2873 FAX：052-972-4168
<http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-3-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>



●第77回施工ワーキング

平成25年2月3日（日）に第77回施工ワーキングを開催し、21名が参加しました。


今回は「学びの時間」で、前号の施工ワーキングのススメの特集にもなった「シェルター構造上部の植生回復」について、これまでの活動や成果を確認しました。グループ活動では、10年間の調査や検討の結果を振り返り、今後の活動につなげる話し合いをしました。

◇フィールドワーク1～植物グループ～

萌芽更新木の管理をしました。

コナラやアベマキの萌芽更新木の剪定を行いました。

（萌芽更新木については、森ぎわ・道ぎわの植生回復としてp.2～3で紹介しています。）

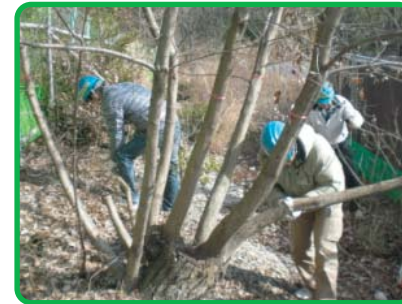

剪定前



剪定後



◇フィールドワーク2～施工グループ～

メンバー全員で定期観測をしました。

定期的に観測している地下水位、湧水量、シェルター構造上部水位の経年変化について検討するにあたり、施工グループのメンバー全員で、現地を回って一通り観測を行いました。

シェルター構造上部の
水位調査（4か所）★2-1



湧水量調査（1箇所）★2-2



地下水位調査（2か所）★2-3



今後は、これらの調査に加え、土壌水分量や沢筋の浸食状況の調査を行っていきます。

