

○インスペクターからのコメント（５６回）

害虫の被害や沢筋の浸食の問題などがでております。すべての問題が道路建設によるものだと単純に考えられてしまわないように、我々が地道にやってきたことや調査を重ね慎重に工事を進めてきたという意気込みを説明していけば市民の後押しをえられると思います。今後も自然に配慮し、地域の人に喜んでもらえる道路づくりに誠実に取り組みましょう。



岡村
インスペクター

これまで私たちが取り組んできた「道路ができて環境が保全されるための活動」は、評価されるものだと思います。今後、騒音の問題や道路舗装など具体的な話になっていきますが、実際に車が通ってどうなるかを考えて取り組んでいけば、課題に対応できるものが必ずできると思います。



藤田
インスペクター

時間をかけて少しずつ積み重ねて、自然の中に生きてる恩返しになる活動をしてきたと思います。そうしてやってきたことに、皆さんの森に対する思いを感じます。私達で選択しているやり方だ、と自信をもってやりましょう。道路が開通した時にはヒメボタルの時期には車を通さないということができるように、通ったときに取り組みが意識されるような仕組みも考えていきたいと思います。




長谷川
インスペクター

工事のお知らせ


弥富相生山線の現在の状況についてお知らせします。仮橋も撤去され、2号橋の橋台が完成しました。

橋台完成

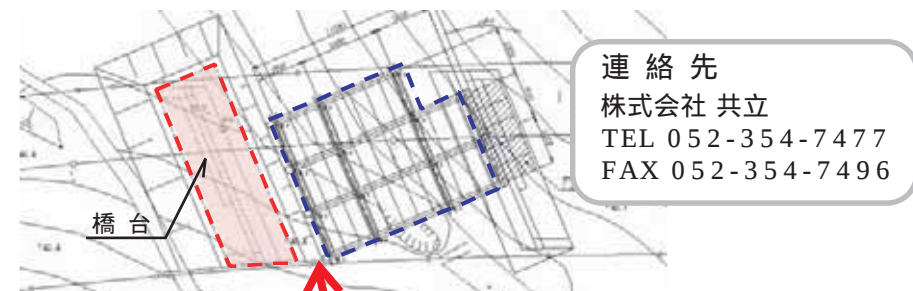

連絡先
株式会社 共立
TEL 052-354-7477
FAX 052-354-7496

平面図

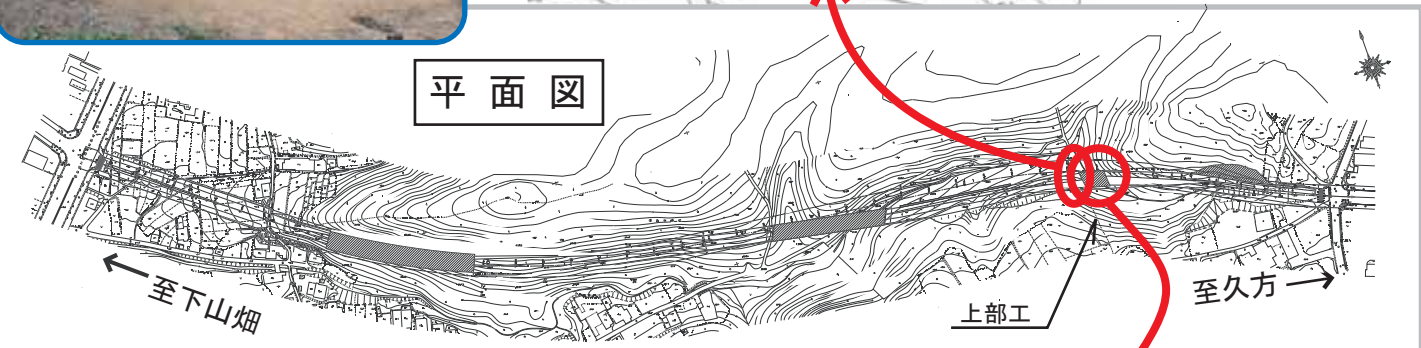

平成21年8月以降の道路改良工事の施工者が決定しましたので、お知らせします。この工事では、久方側から橋りょうの上部を施工します。工事中は、地域の皆様方には何かとご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いいたします。

工事名 市道弥富相生山線第4号道路改良工事
工事場所 天白区天白町地内
工事期間 平成21年7月24日から平成22年2月28日まで
工事内容 橋りょう上部工

連絡先

名古屋市天白土木事務所
TEL 052-803-6644 FAX 052-805-1594
工務係長 伊東 新治 / 担当者 外山 貴志
株式会社 川田建設株式会社
TEL 052-222-3310 FAX 052-222-3315
現場代理人 花本 実

問い合わせ先

名古屋市 緑政土木局 道路部 道路建設課内 「環境に配慮した道づくり」施工ワーキング事務局
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話：052-972-2864 FAX：052-972-4168
<http://www.city.nagoya.jp/shisei/jigyokeikaku/douro/kankyo/>

「環境に配慮した道づくり」施工ワーキングだより 第43号

施工ワーキングのススメ



●第56回施工ワーキング

平成21年7月5日（日）に第56回施工ワーキングを開催し、27名が参加しました。

今回は、法面の植生回復の方法や舗装について設計案を確認しました。

法面の植生回復について

切土法面の設計案の確認



土砂流出防止柵の移設

《土砂流出柵を移設します》

切土法肩は、森側から植生が回復してきています。土砂流出柵を道路側に移設して、回復しやすい状況をつくります。


《配慮事項》
森への影響の緩和 → 植栽
土砂流出防止 → 植生ネット
法尻の安定 → 蛇カゴの設置
植生土のうの設置



弥富相生山線の舗装を考えよう！（その2）

舗装の設計案の確認

① 一般部

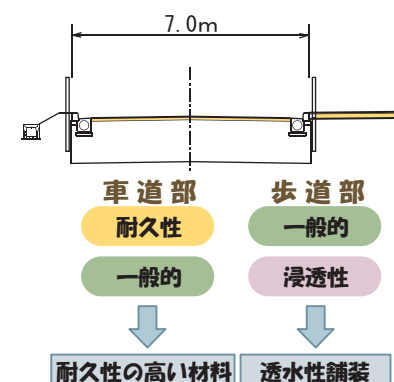

《設計での配慮事項》

《設計案》

《今後決めること》

日当たりの良い場所では、温度の上昇の小さい舗装を検討します。

② シェルター構造部

