


## 余裕期間制度について

参考資料

### ◆手持ち工事と余裕期間を設定した工事の関係イメージ

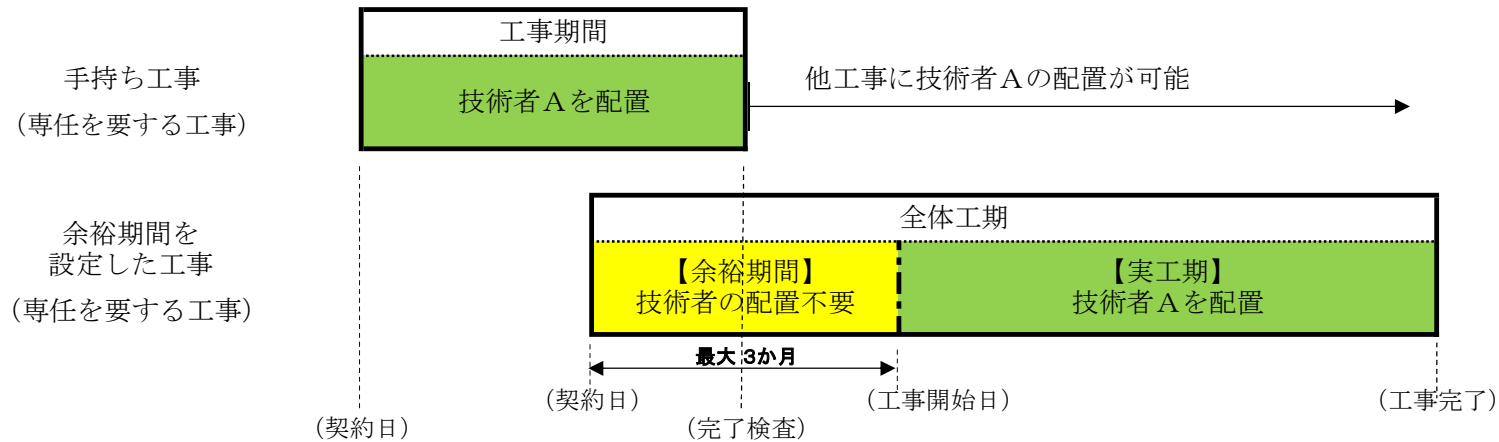

### ◆受注者の手続き等

|             | (契約日)      | (工事開始日)                                       | (工事完了) |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|--------|
|             | 全体工期       |                                               |        |
|             | 【余裕期間】     | 【実工期】                                         |        |
| ・ 契約保証      | 契約締結と同時に   | —                                             |        |
| ・ 工事工程表     | 契約締結後14日以内 | —                                             |        |
| ・ 工事開始日届    | 契約締結後14日以内 | —                                             |        |
| ・ 前払金       | —          | 工事開始日から20日以内                                  |        |
| ・ 建設業退職金制度  | —          | 工事開始日から1か月以内に収納書提出                            |        |
| ・ 工事着手届     | —          | 工事開始日から14日以内に提出                               |        |
| ・ 工事着手      | —          | 工事開始日から30日以内                                  |        |
| ・ 法定外労働災害保険 | —          | 工事開始日を保険期間の開始日とする<br>(工事着手届と同時に提出)            |        |
| ・ コリンズ登録    | —          | 工事開始日から15日以内 (土日祝除き)<br>【 現場代理人、技術者の従事期間とする 】 |        |

### ◆現場代理人

技術者と同様に余裕期間中は配置が不要です。しかし、受注者との連絡手段は確保する必要があります。
